

計画の進捗状況等のご説明

平成28年4月11日(月) 19:00～ 於:丸山公民館




東海旅客鉄道株式会社

2016/4/11
説明資料

本日のご説明内容


資料2

- ① 本日の趣旨、これまでの経緯
- ② 計画の進捗状況
- ③ 工事計画の概要
- ④ 工事車両の運行計画・安全対策
- ⑤ 今後の予定

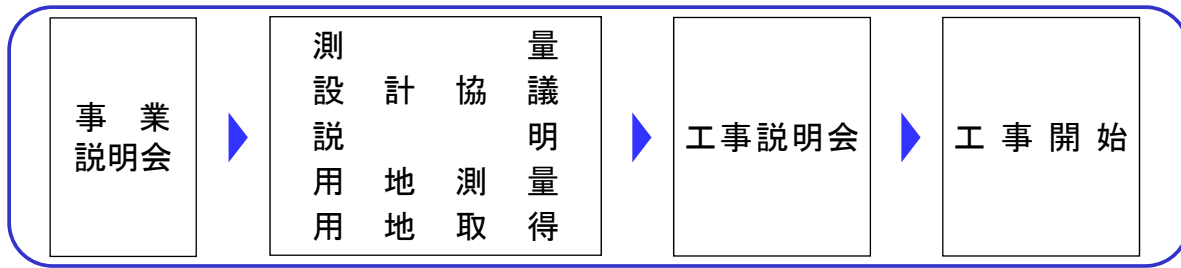

- 事業説明会 (H26年12月)
- 基準点測量 (H27年7月)
- 周辺地形の測量 (H28年2～3月)
- 計画の進捗状況等のご説明 (本日)


- 事業説明会で皆様から頂いたご意見を踏まえて、工事計画の検討を深めるとともに、関係機関等と協議を進めてまいりました。
- 本日は、工事計画の概要と、事業説明会で特にご意見の多かった工事用車両の運行方法等についてご説明させていただきます。
- そのうえで、皆様の忌憚のないご意見や疑問点について伺い、ご回答させていただきたいと考えております。
- 引き続き、皆様のご意見も伺いながら、今後の計画や関係行政機関等との協議を進めてまいりますので、よろしく願いいたします。

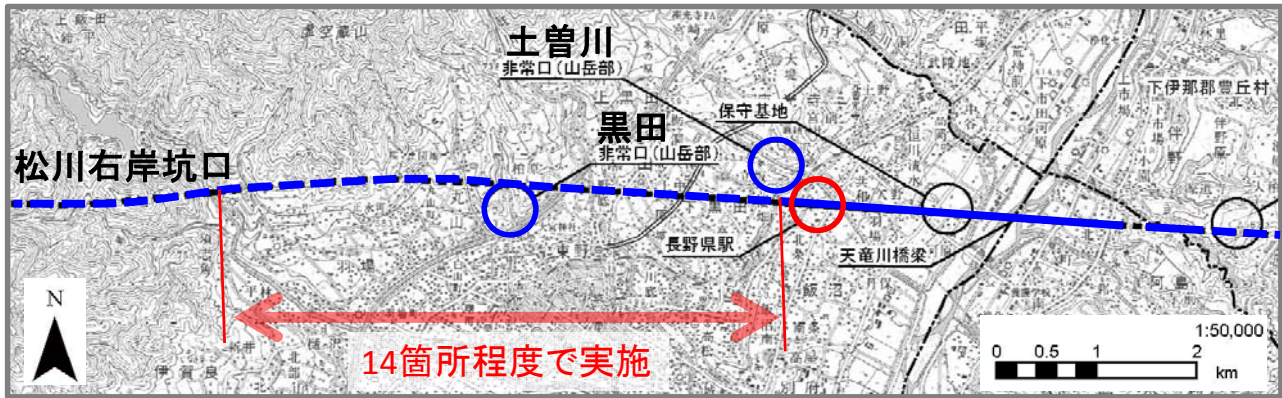

地質調査のイメージ



- 今後、トンネルの工事計画を検討するため、地質調査を実施します
- 14箇所程度での調査を計画しており、地権者の方からご了承を頂いたあと、関係する地域の皆様に回覧等で周知し、作業を実施します
- 全体の期間は本年4月から1年程度（1箇所あたり3ヶ月程度）を予定しており、準備のできた箇所から順次実施してまいります

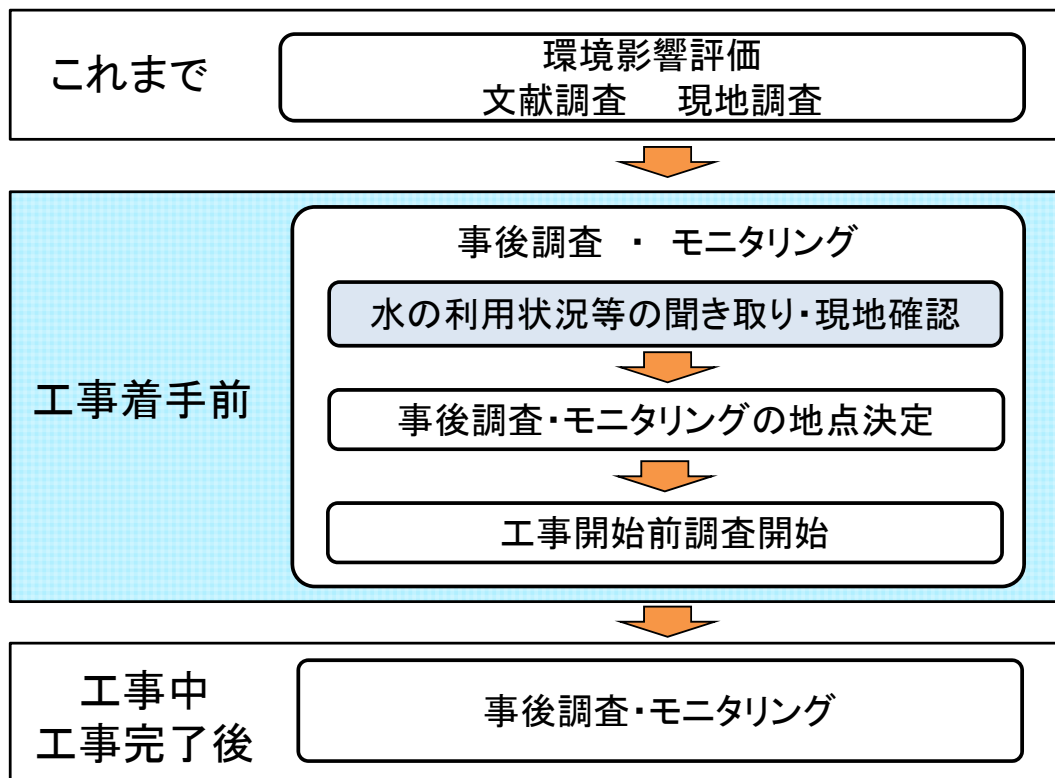

調査票結果を基に聞き取り・現地確認を実施

丸山地区内


調査項目	調査箇所数	実施時期
表流水 (河川・沢水)	全27地点 完了	H27. 6月～H28. 2月
井戸水	全95箇所 完了	H27. 6月～H28. 2月


事後調査・モニタリングの地点の選定

工事開始前調査開始

- ・代表的な地点において、月1回調査を実施します。
- ・代表的な調査箇所で変化がみられた場合には、他の箇所でも調査を実施してまいります。


- ・工事で使用する作業ヤードは、周辺の地形状況等も踏まえて検討を進めています。
- ・幹線道路までの通行経路は、周辺道路の状況を踏まえて、市道城山線を往復通行したいと考えています。

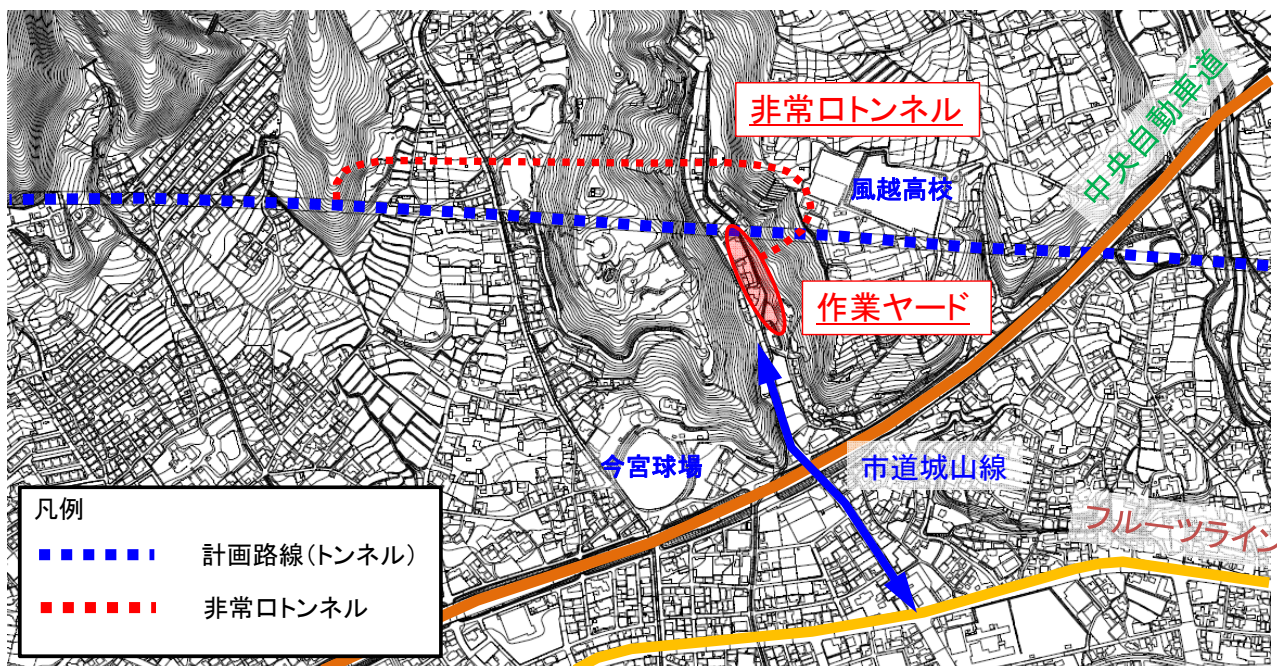

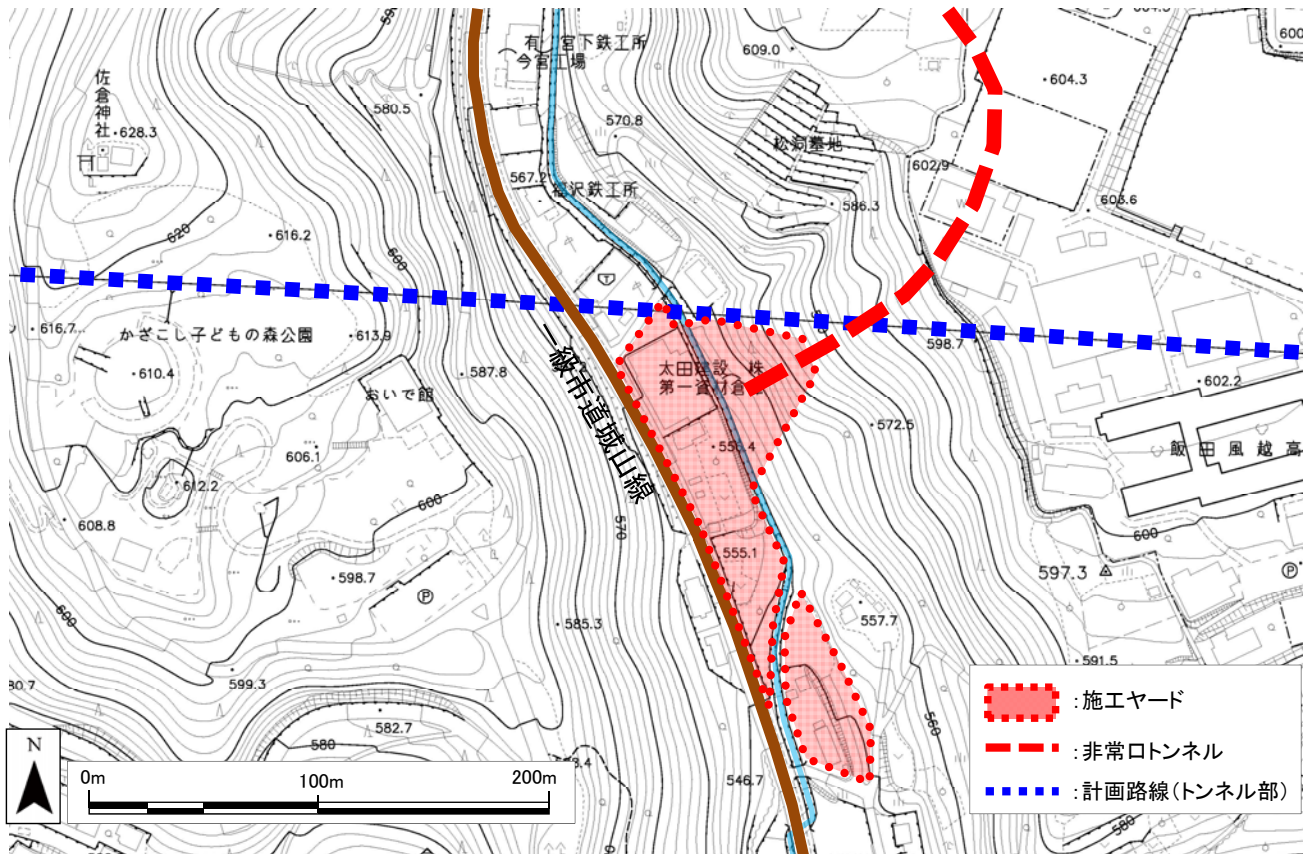

※この図に示す計画範囲等は現時点での計画の概要であり、最終形とは異なる可能性があります。

- トンネル工事、橋りょう工事を計画しています。
- 工事で使用する作業ヤードは、周辺の地形・道路状況も踏まえて、妙琴公園内の一部敷地を使用させて頂きたいと考えています。

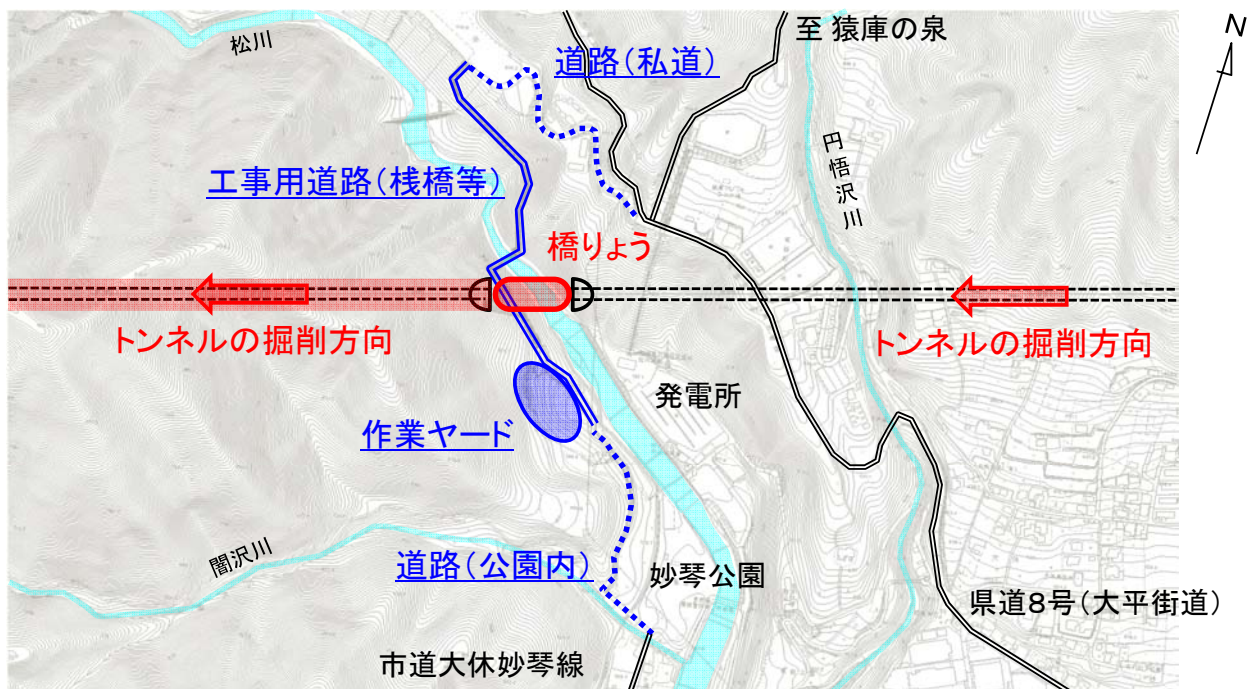

- 工事用車両の運行経路や方法について、周辺道路の幅員や利用状況を踏まえて、地域の皆様への影響をできる限り低減させるように、工事計画の検討を進めてまいりました。
- 今後、工事箇所から県道羽場大瀬木線までの間における、工事用車両の運行計画については、以下を基本として検討を深めたいと考えています。

【準備工事期間中】 ※作業ヤード、工事用道路の整備

市道(松川右岸側)と県道(松川左岸側)を、それぞれ往復通行


【本工事期間中】 ※トンネル掘削、橋りょうの工事

主要となる工事用車両(ダンプトラック)は、一方通行で計画

【準備工事期間中】 工事用車両の運行経路



2016/4/11
説明資料

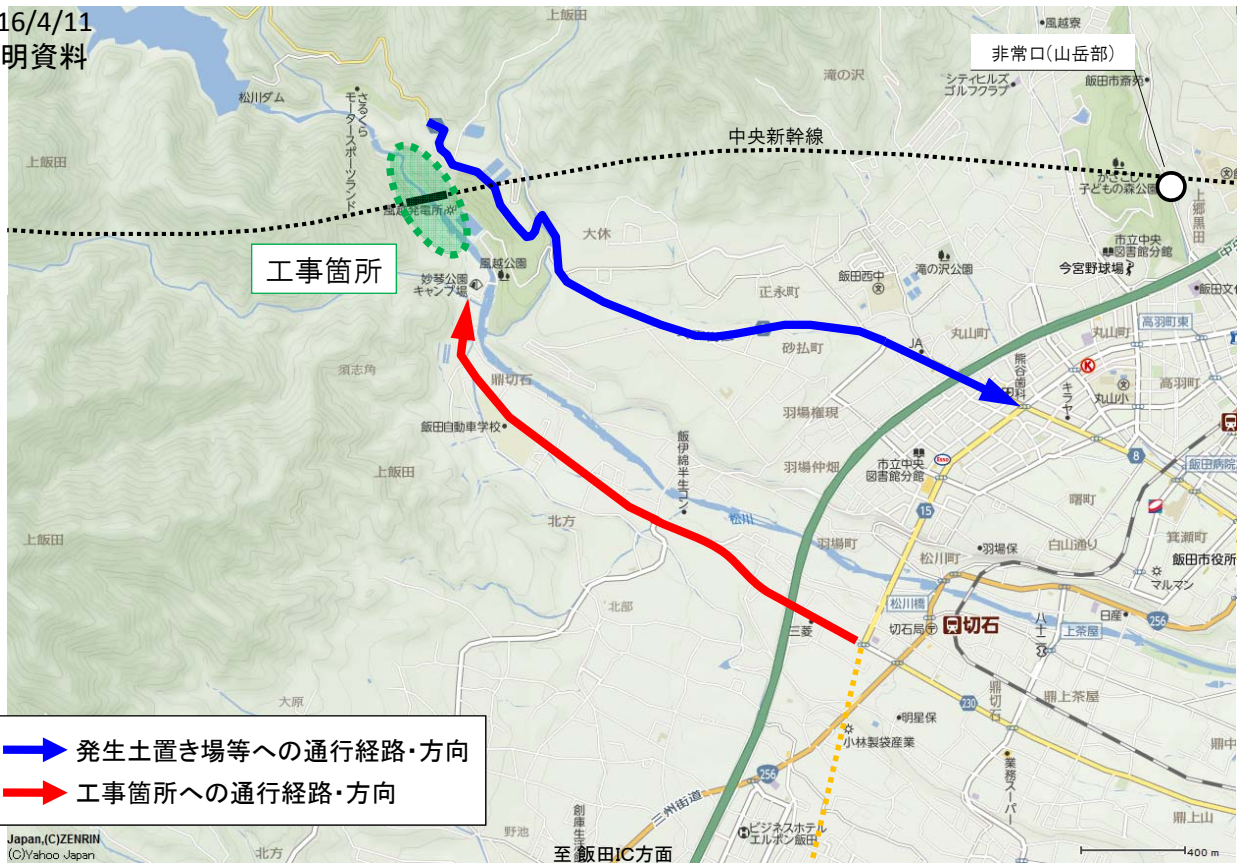

2016/4/11
説明資料

工事用車両の運行計画

- ダンプトラック以外の工事用車両(資材運搬車等)も、同じ経路を通行する計画を考えていますが、これに因らない場合は、事前に地元とご調整のうえ、決定してまいります。
- 大型特殊車両(重機搬入出時のトレーラー等)は、事前に地元と調整のうえ、必要な申請手続きを行い対応してまいります。
- 発生土置き場までの広域的な運行経路は、現在調整中です。

- 工事中は部分的な拡幅や待避所を設置して、一般車両が安全に通行できる方法を計画します。
- 運行方法、運行時間帯、台数、安全対策、待避所の具体的な計画は、地元とご相談しながら決定し、工事説明会でご説明します。
- その他、以下の対策も実施して工事用車両の通行に際して配慮してまいります。
 - ①: 安全運転の徹底
交通法規遵守、空ぶかし・急発進・急ハンドルしない、過積載の防止
 - ②: 安全運転教育
運行経路、法定速度、地元車優先（入場時及び定期的）
 - ③: 工事用車両の明示
ステッカーを貼り、関係車両であることを明示

		H27年度		H28年度				H29年度				H30以降
		秋	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	
ご説明の場				本日 ★	★	★ 工事説明会 (松川)		★		★ 工事説明会 (非常口)		
用地取得等 (非常口)					用地 説明会	土地や建物等の 測量及び調査	補償金 算定	(ご説明)	契約締結	引き渡し		
設計・施工計画		[Progress bar spanning from H27秋 to H29秋]										
地元・関係先との ご協議		[Progress bar spanning from H27秋 to H30以降]										
工 事	松川 トンネル											本工事(約6年)
	橋りょう											※平成31年度頃着工(予定)
	非常口											本工事(約5年)

※ご協議の状況等により時期が変更となる場合があります。

※用地取得等の〔 〕は手順を示しており、時期は決まっておりません。

東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線長野工事事務所 (TEL 0265-38-6500)

環境保全事務所(長野) (TEL 0265-52-6511)

住所 長野県飯田市元町5451

(受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時～17時)

