


長野県駅(仮称) 工事概要

資料2

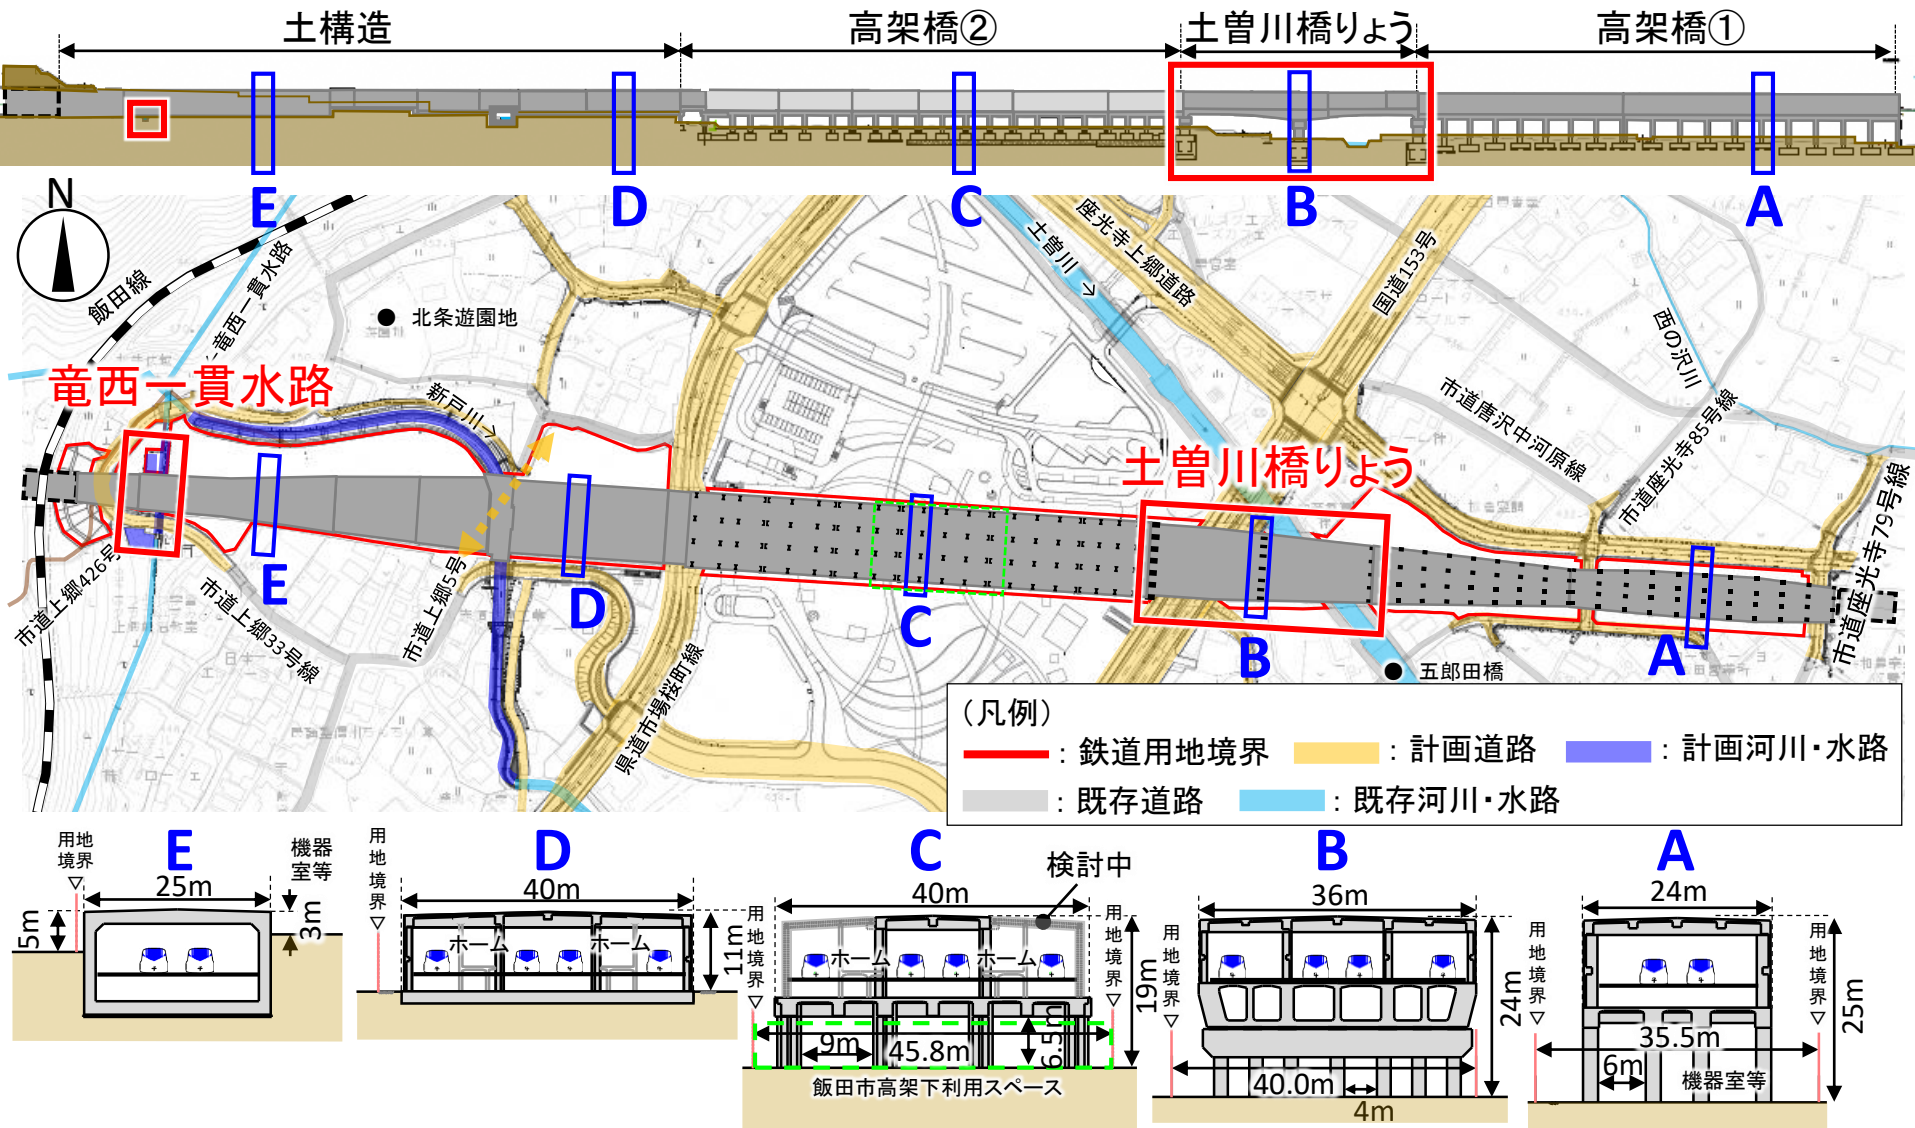

※今後の設計・協議等の進捗により変更になる場合があります。


長野県駅(仮称) 工事工程

年度	令和4 (2022)				令和5 (2023)				令和6 (2024)				令和7 (2025)				令和8 (2026)				令和9 (2027)				令和10 (2028)				令和11 (2029)				令和12 (2030)				令和13 (2031)			
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3
工事施工ヤード 整備工																																								
高架橋①																																								
土曽川橋りょう																																								
高架橋②																																								
土構造																																								
新戸川付替え																																								
竜西一貫水路 付替え																																								


※工程は令和6年8月までは実績、それ以降は令和6年9月時点の計画であり、工事状況等により変更となる場合があります。

竜西一貫水路付替え

断面図

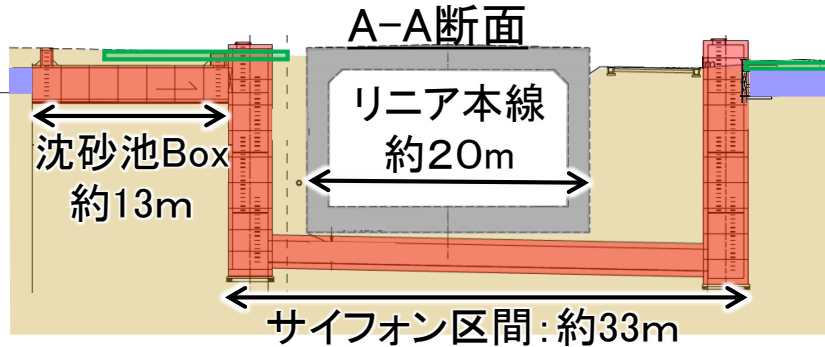

平面図

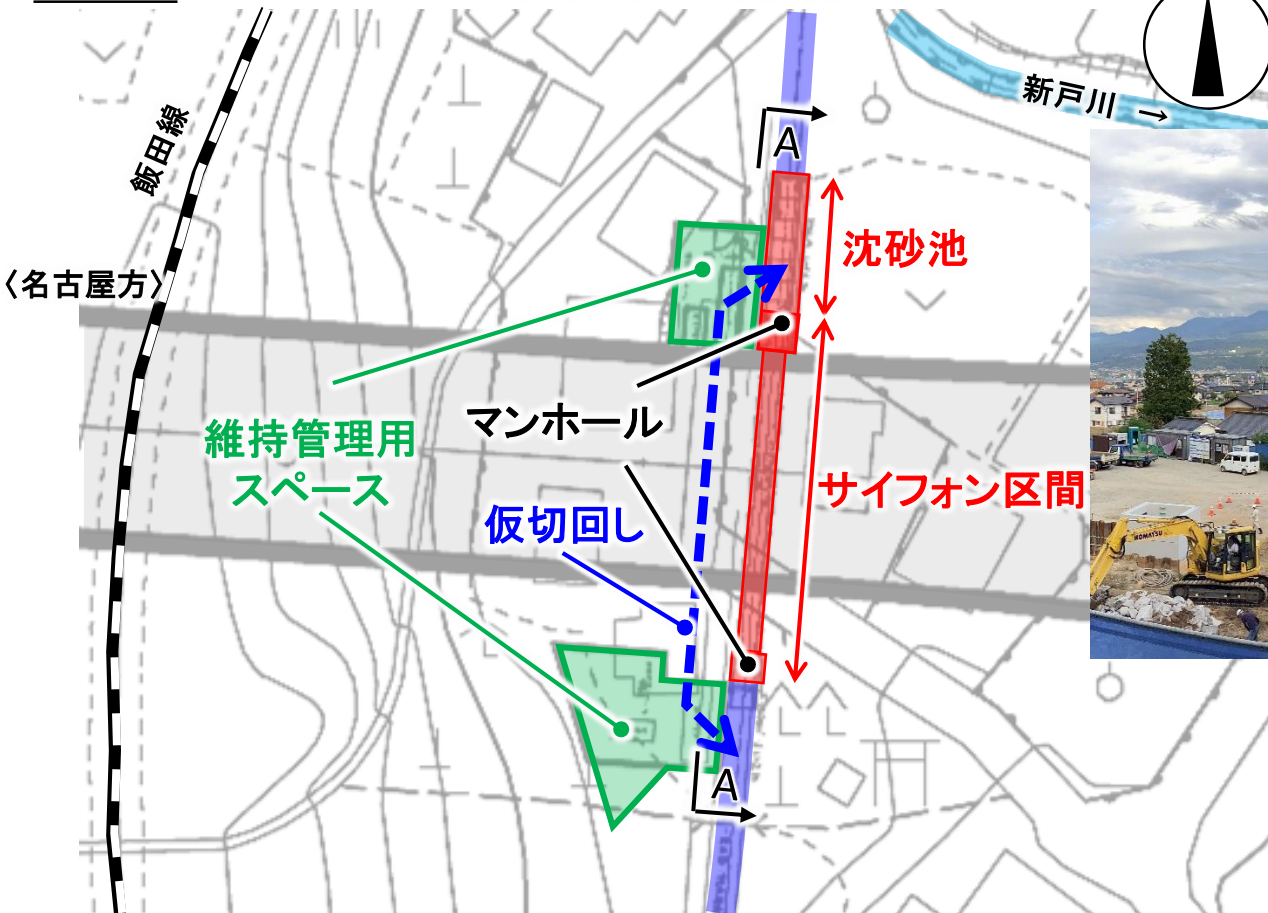


※令和6年10月撮影



施工状況

※今後の設計・協議等の進捗により変更になる場合があります。

土曾川橋りょう

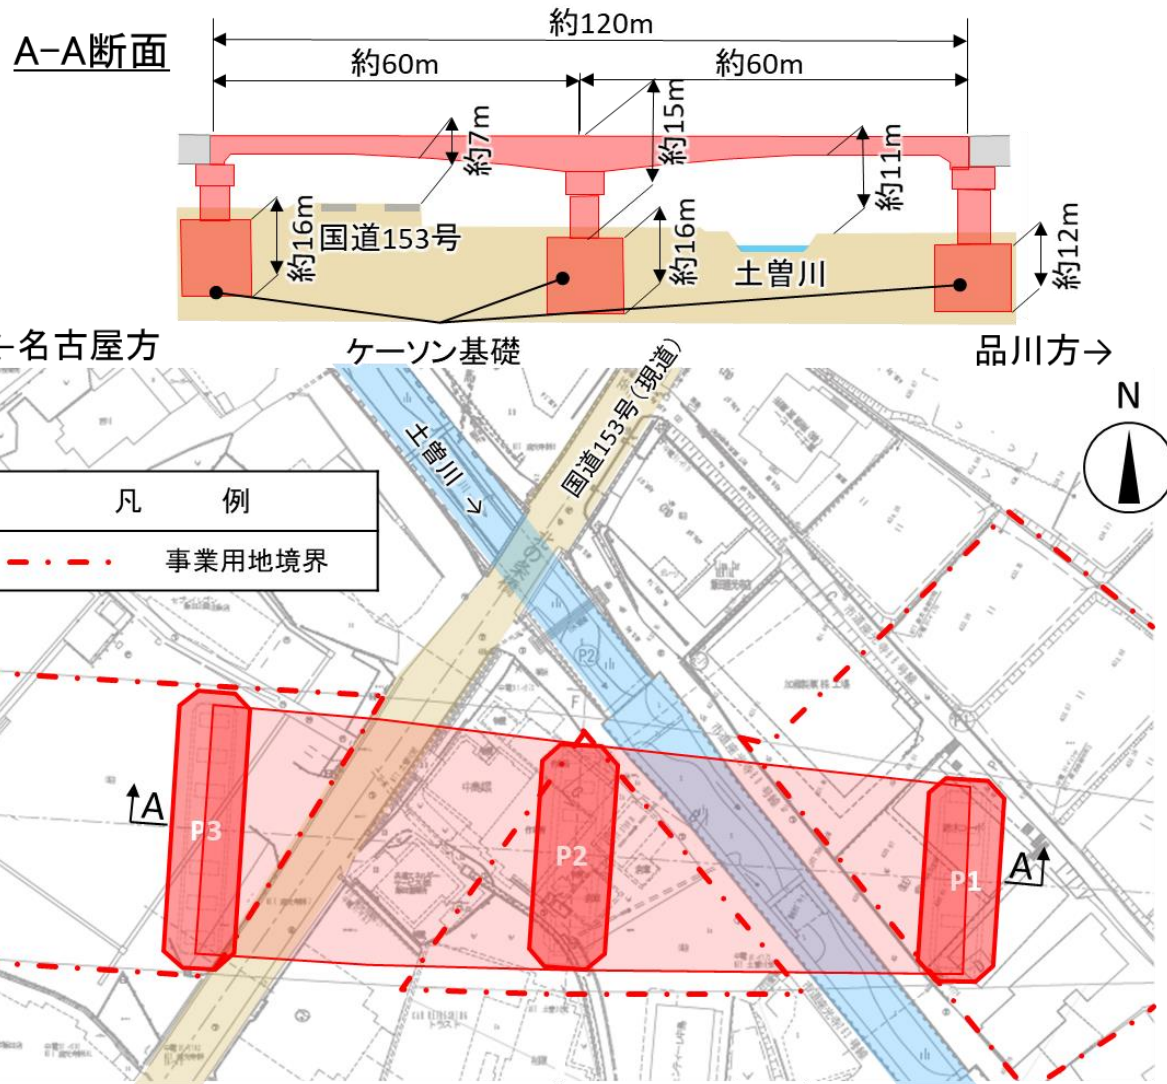

※令和6年10月撮影



P1橋脚 施工状況

※今後の設計・協議等の進捗により変更になる場合があります。
