

天竜川橋りょうの工期延伸等について

令和6年11月25日（月） 18:30～ 於：麻績の館



【事業者】

東海旅客鉄道株式会社

【施工者】

中央新幹線、天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体

進捗状況（天竜川橋りょう）

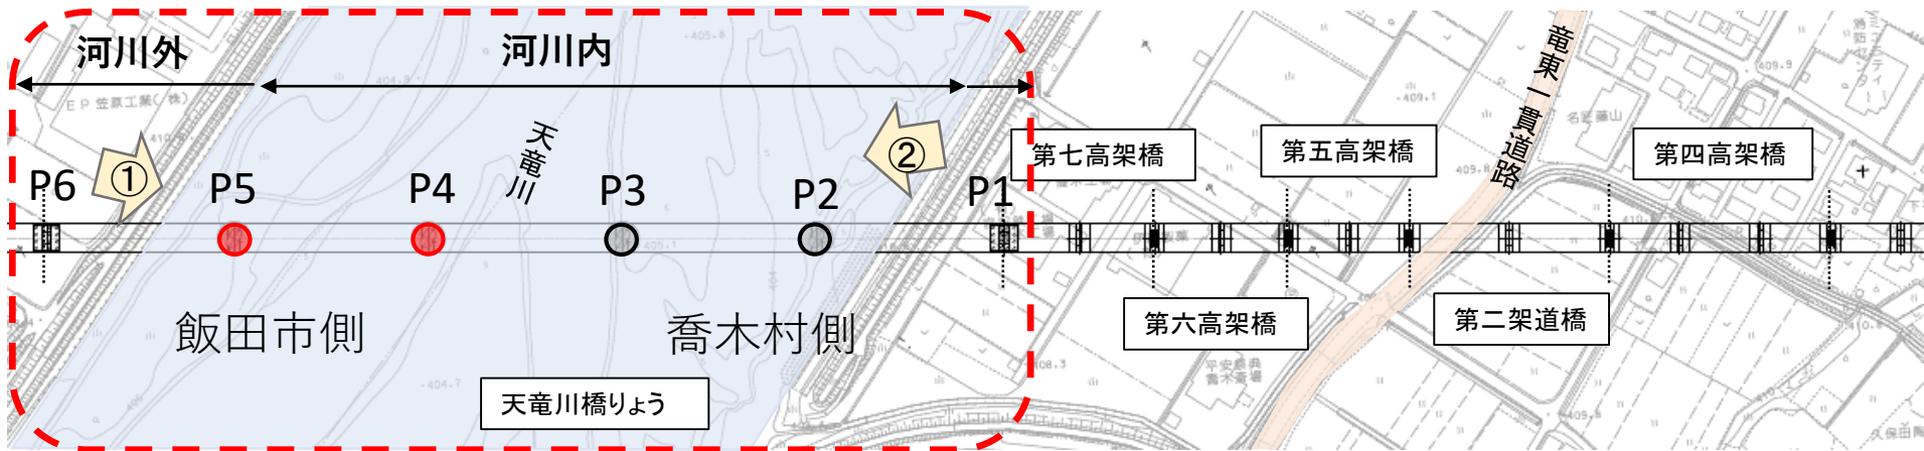

天竜川橋りょうの工事工程

	2023年度 (R5)				2024年度 (R6)				2025年度 (R7)				2026年度 (R8)				2027年度 (R9)				2028年度 (R10)						
	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3			
飯田市側	河川内				下部工				下部工				上部工				上部工等				※2026年度以降と説明						
	河川外				下部工				下部工				上部工				上部工				上部工				上部工等		
喬木村側	工事施工ヤード整備工・道路改良工				下部工				下部工				上部工				上部工等				※2026年度以降と説明						
	上部工				上部工等				上部工				上部工				上部工				上部工等						

: R5.6説明会時
 : 今回

※工事工程については、協議等により変更となる場合があります。

変更工期と今後の見通し

●変更工期

- 変更前：2020年（令和2年）7月14日 ～ 2026年（令和8年）3月31日
- 変更後：2020年（令和2年）7月14日 ～ 2029年（令和11年）3月31日

●今後の工事工程

- 河川内の下部工工事に目途が立ち、上部工の工事工程を精査した結果、2026年度以降としていた計画が2028年（令和10年）度末に完了する見込みとなった。
