


**①令和7年度から予定しているリニア駅前広場整備に関連する土木工事
の予定と市道の通行止め等の予定について（飯田市 リニア整備課）**

- 1 リニア本線北側の工事予定
- 2 工事中の市道の通行規制と市道認定の廃止について（リニア本線北側）
- 3 リニア本線南側の工事予定
- 4 工事中の市道の通行規制と市道認定の廃止について（リニア本線南側）
- 5 工事中の雨水排水の処理と農業用水路の仮設について



1 リニア本線北側の工事予定

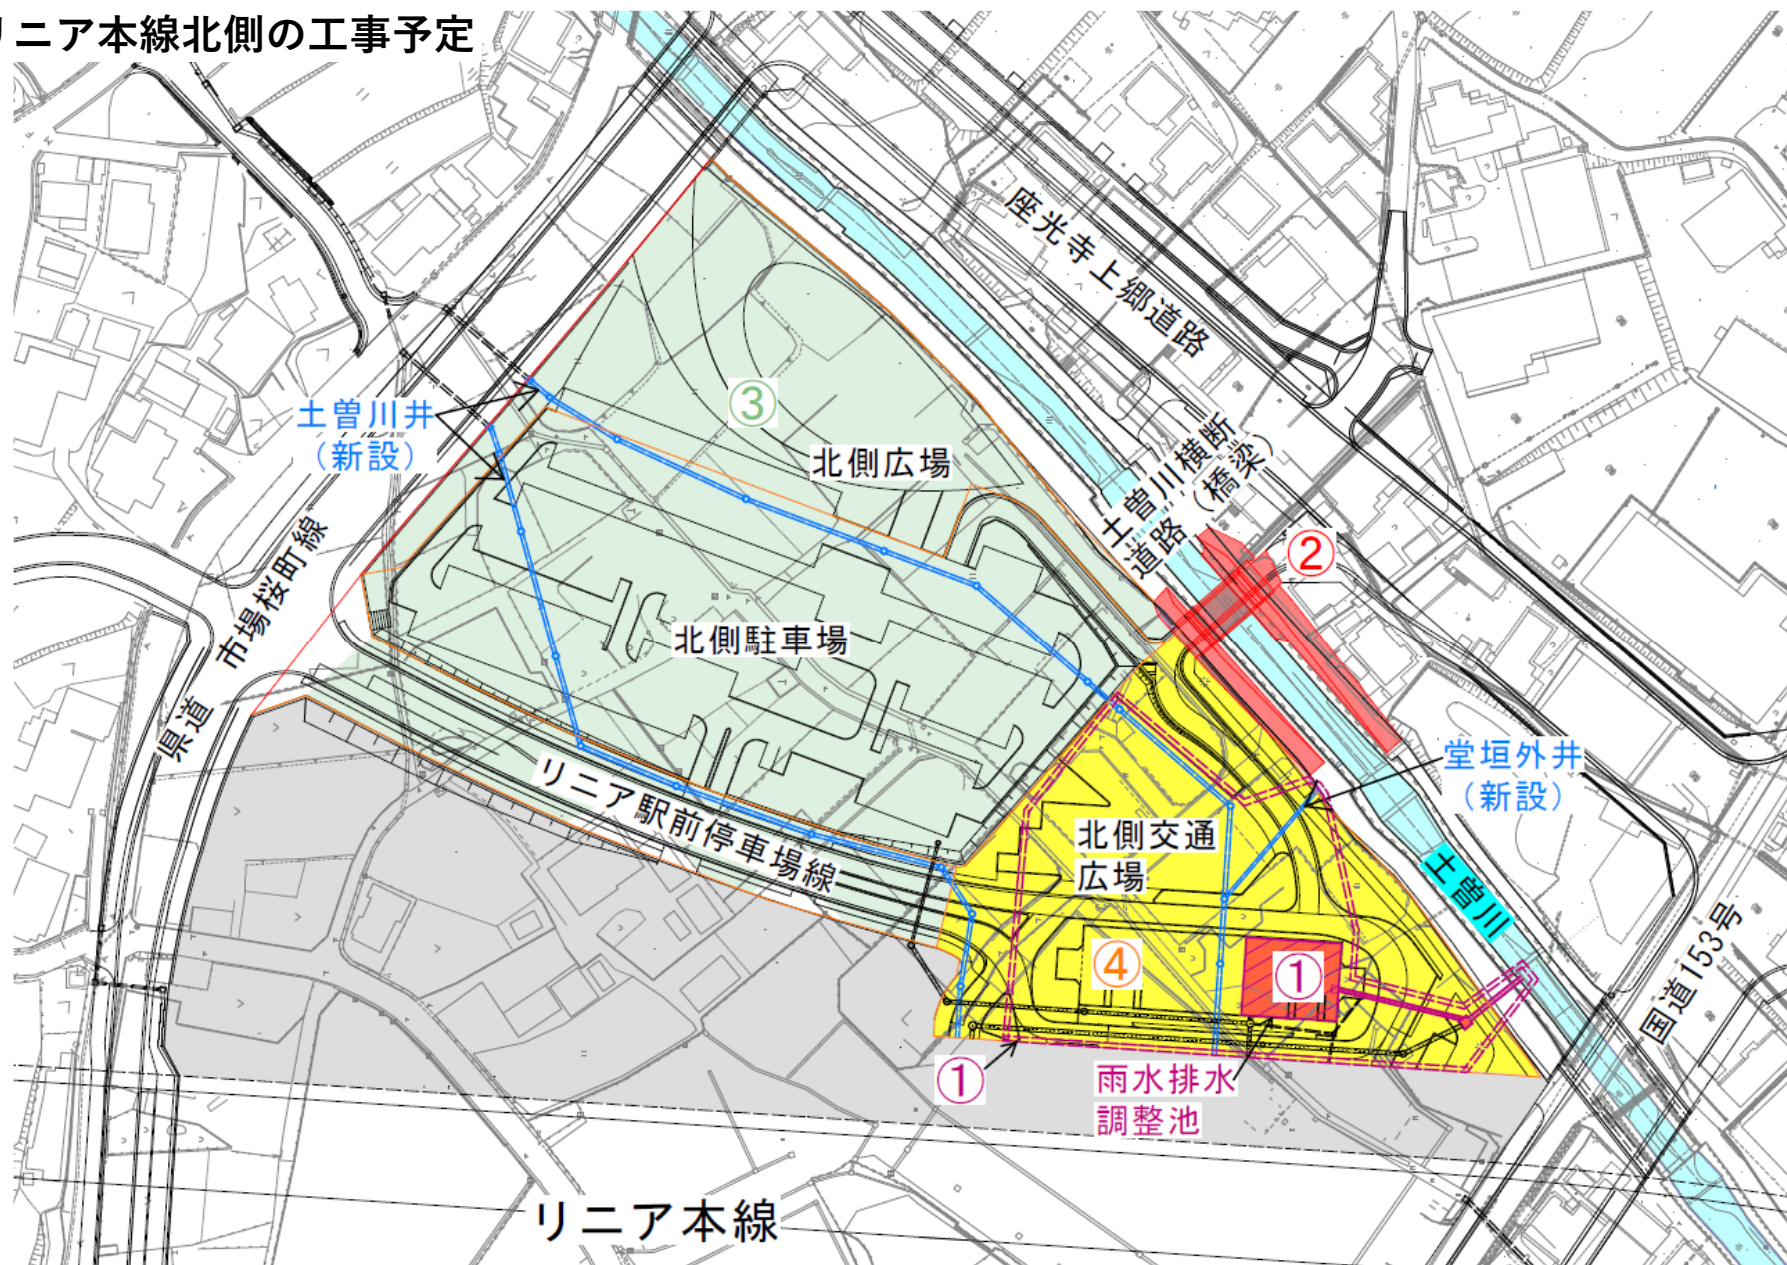


1 リニア本線北側の工事予定

工事範囲	工事内容	工事期間（予定）	施工業者
①	<u>雨水排水調整池の設置</u> 、土曾川への放流管の設置 住宅基礎等の撤去、農業用水路や雨水排水の暗渠管の設置 ※本日工事内容の説明をさせていただきます	令和7年6月上旬～ 令和8年2月末	北沢建設(株)
②	<u>土曾川横断道路の橋梁架設工事</u> 下部工（座光寺側）、上部工、河川管理道路	令和7年9月頃～	未定
③	<u>リニア駅前停車場線、北側駐車場、北側広場</u> （土地の造成、排水構造物の設置、土曾川井の暗渠管及び柵の設置、路盤工など）	令和7年8月頃～	未定
④	<u>北側交通広場</u> （土地の造成、排水構造物の設置、土曾川井、堂垣外井の暗渠管及び柵の設置、路盤工など）	令和7年10月頃～	未定

- ・ 工事内容及び工事期間は、工事の進捗状況や天候、周辺工事との調整によって、今後変更となる場合があります。
- ・ 今後、工事の施工業者さんが決まり、詳細な工程等が作成できた段階で、地区の皆さまへ通知等でお知らせさせていただきます。

2 工事中の市道の通行規制と市道認定の廃止について（リニア本線北側）

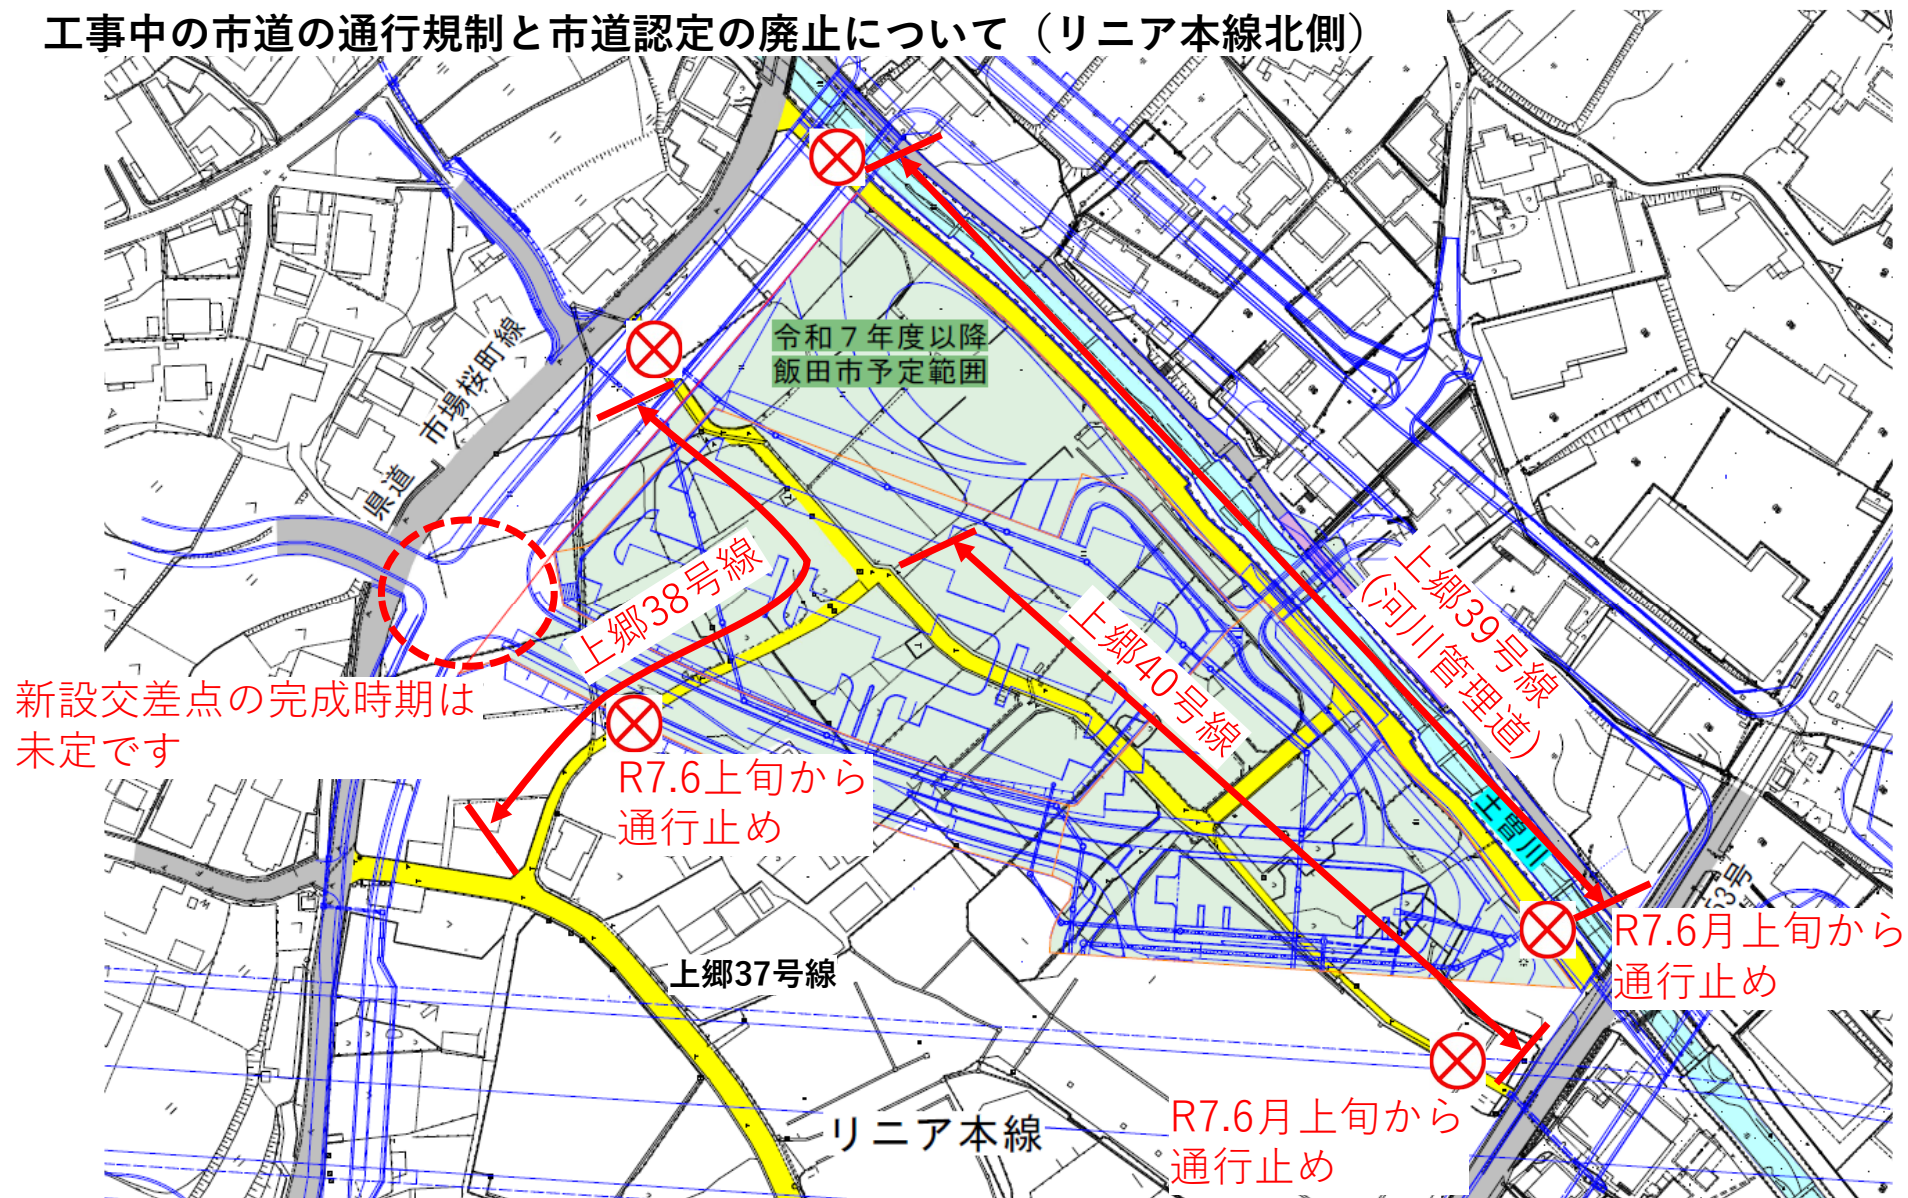


2 工事中の市道の通行規制と市道認定の廃止について（リニア本線北側）

	通行止め開始時期	市道認定廃止の 手続の時期	その他
市道上郷38号線	令和7年6月上旬より	未定 (上郷37号線と 同時期を予定)	市場桜町線との交差点は令和7年4月より 通行止め。 工事関係者の車輛のみの出入りとさせて いただきます。
市道上郷39号線	令和7年6月上旬より	令和7年度末予定	市場桜町線側の交差点は令和5年度より通 行止め。 工事関係者の車輛のみの出入りとさせて いただきます。 市道認定は廃止され河川管理道となるた め、一般車両の通行はご遠慮願います。
市道上郷40号線	令和7年6月上旬より	令和7年度末予定	

- ・市道認定の廃止にあたっては、地域協議会の場合でも説明をさせていただきます。
- ・地区の皆さまには大変なご不便をおかけしますが、市道上郷37号線への迂回をお願いいたします。
- ・市道上郷37号線・上郷38号線については、今後の事業の進捗状況をみながら、通行止めの時期と市道認定の廃止の時期についてご相談をさせていただきます。

3 リニア本線南側の工事予定

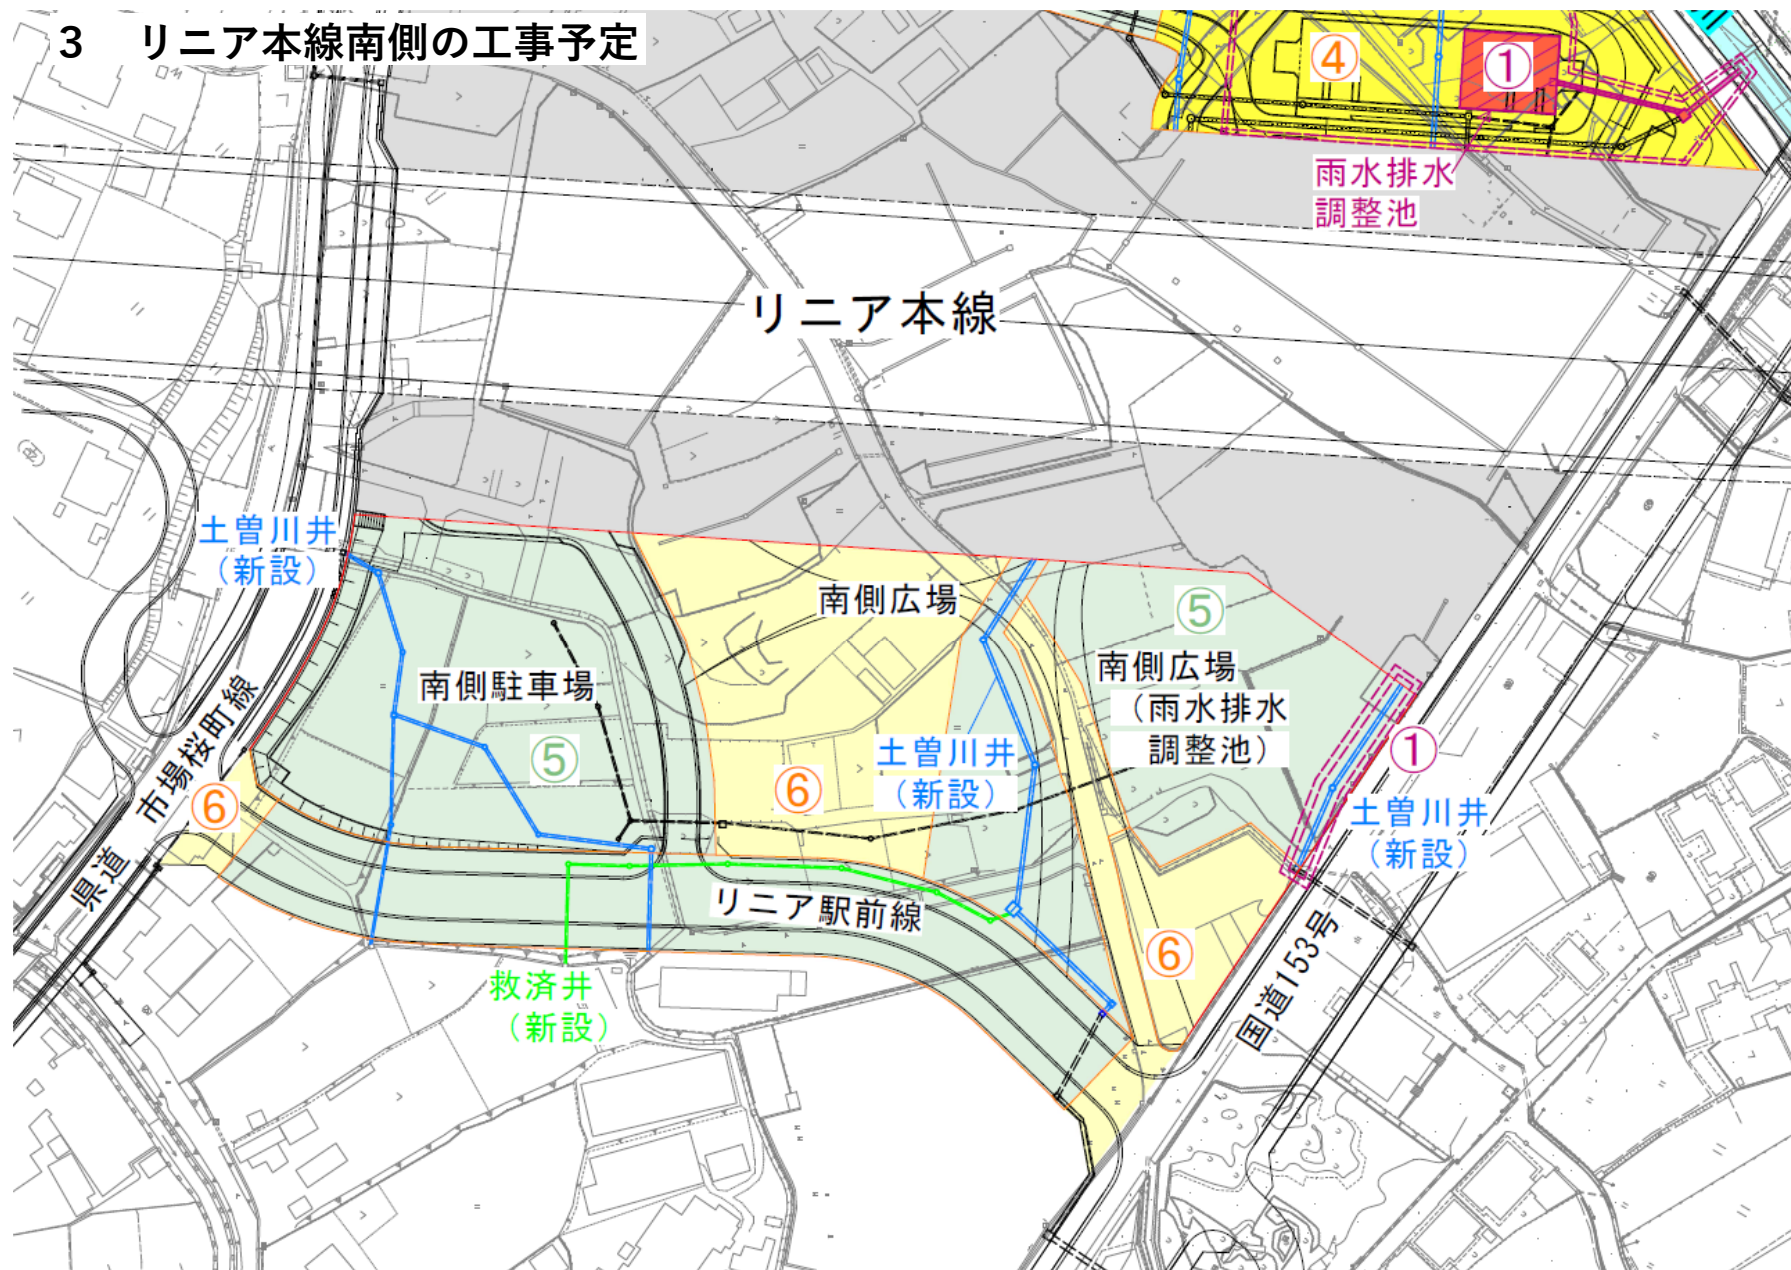

3 リニア本線南側の工事予定


工事範囲	工事内容	工事期間（予定）	施工業者
①	土曾川井の暗渠管敷設（旧マツダさん敷地内）	令和7年6月下旬～ 令和7年12月頃	北沢建設(株)
⑤	<u>リニア駅前線、南側駐車場、南側広場</u> （L型擁壁の設置、盛土、電線共同溝の設置、排水構造物の設置、土曾川井と救済井の暗渠管及び柵の設置、路盤工、土地の造成、雨水排水調整池）	令和7年9月頃～	未定
⑥	<u>リニア駅前線、南側広場</u> （土地（広場）の造成、管理棟の建設、国道・県道交差点部の道路改良等）	令和8年度以降 工事発注予定	未定

- ・ 工事内容及び工事期間は、工事の進捗状況や天候、周辺工事との調整によって、今後変更となる場合があります。
- ・ 今後、工事の施工業者が決まり、詳細な工程等が作成できた段階で、地区の皆さまへ通知等でお知らせさせていただきます。

4 工事中の市道の通行規制と市道認定の廃止について（リニア本線南側）



5 工事中の雨水排水の処理と農業用水路の仮設について（リニア本線北側）

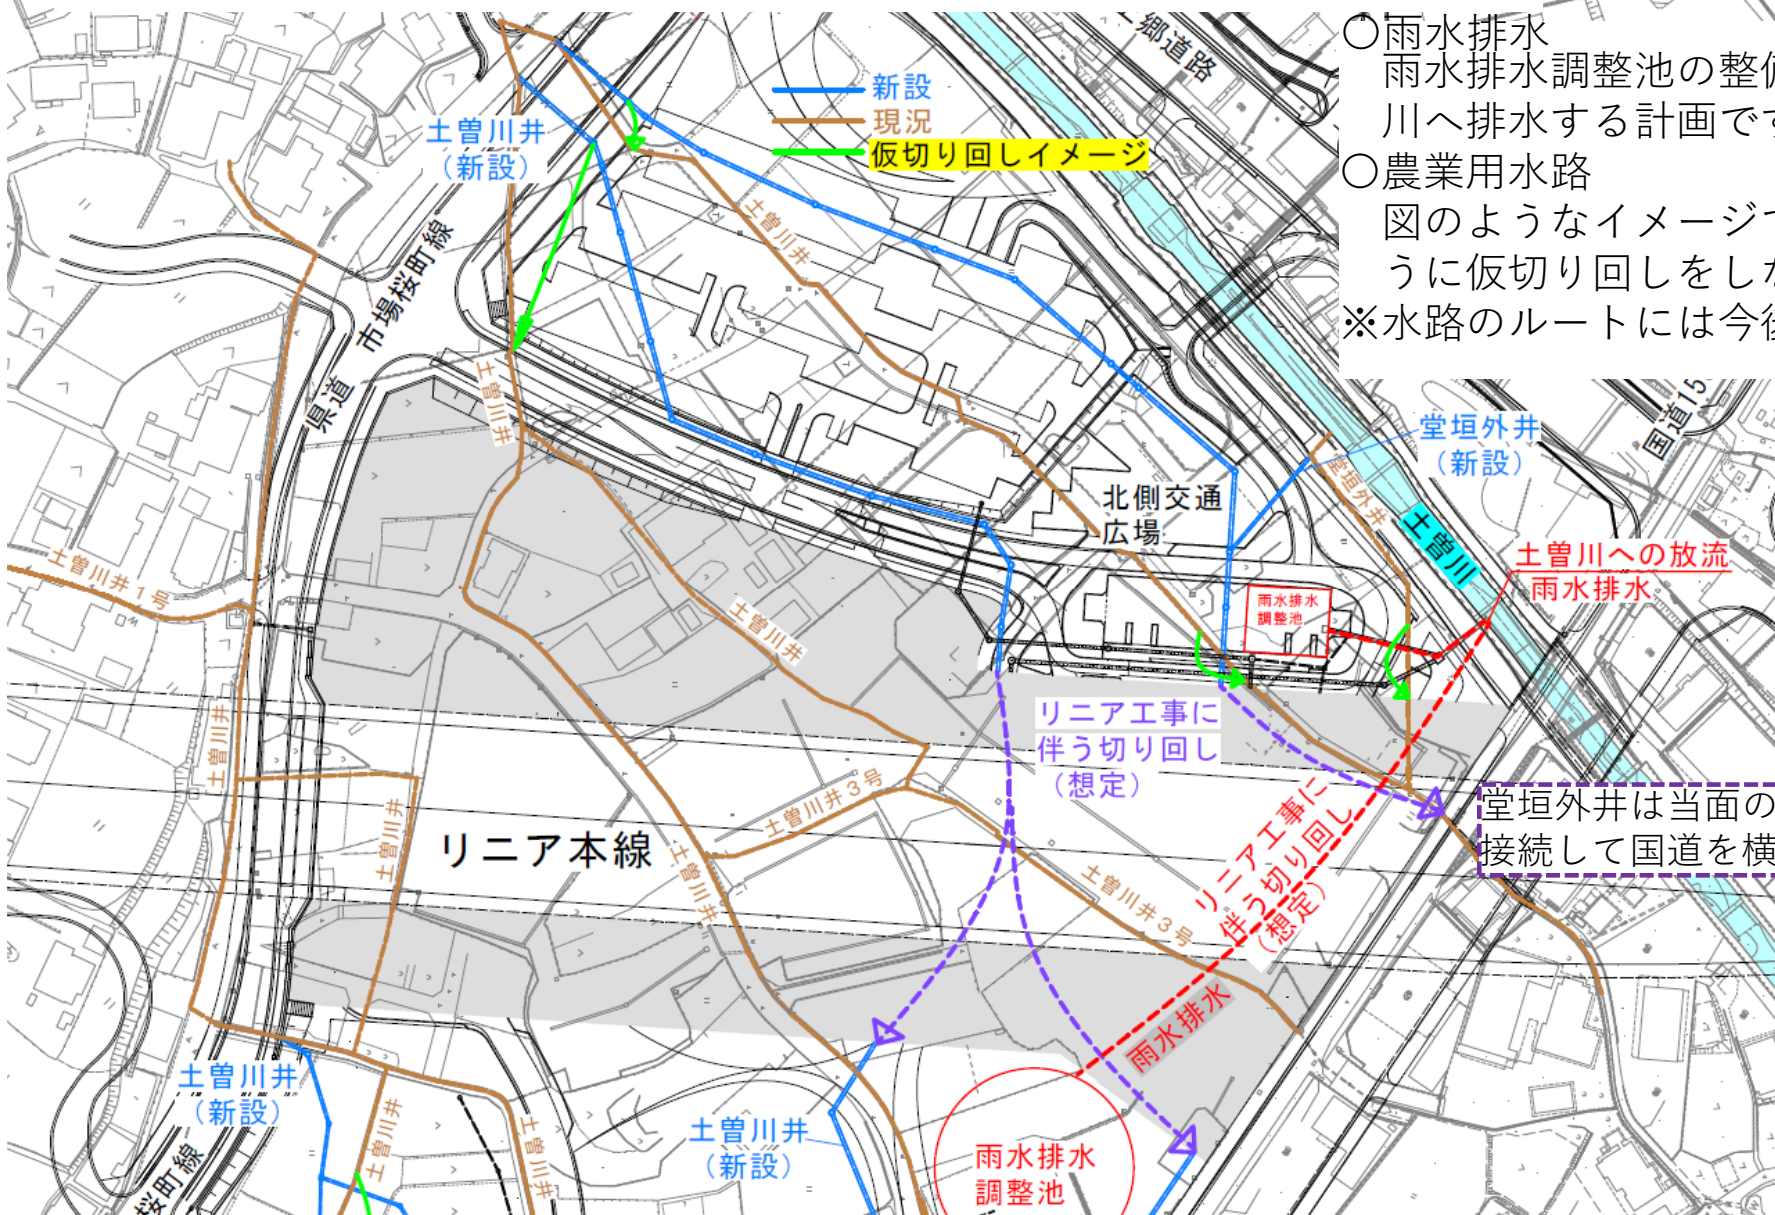

- 雨水排水
雨水排水調整池の整備が出来次第、土曾川へ排水する計画です
- 農業用水路
図のようなイメージで、流量を減らさないように仮切り回しをしながら工事を進めます。
※水路のルートには今後変更があります。

堂垣外井は当面の間、現在の暗渠へ接続して国道を横断する計画です

