

第2回 リニア中央新幹線及びその関連工事に係る三者調整会議

日 時 : 令和3年6月2日(火) 9:00～10:00

場 所 : 飯田市役所 第二委員会室

1. 開会

2. あいさつ

3. 各事業者の令和3年度事業報告

4. 工事調整部会報告

5. 用地調整部会報告

6. 新たな情報発信について

7. 意見交換

8. 閉会

第2回 リニア中央新幹線及びその関連事業に係る三者調整会議 準備会議 出席者名簿

令和3年6月2日(水) 9:00～ 飯田市役所A棟2階第二委員会室

飯田会場	所 属		職 名	氏 名
	飯田市		市長	佐藤 健
		建設部	部長	米山 博樹
			参事兼課長	毛利 勇
		リニア推進部	部長	細田 仁
			課長	牧島 光宏
			課長	小倉 博明
			課長	下平 泰寛
		東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線推進本部 中央新幹線建設部 名古屋建設部 中央新幹線長野工事事務所		所長 平永 稔
	長野県 飯田建設事務所		所長	細川 容宏
		整備課	課長	丸山 泰正
		関連事業課	課長	柴草 真也
		用地第二課	課長	山田 俊幸
		リニア整備推進事務所	次長	北原 雅勇
			課長	松本 勇二
			課長	折井 克壽

リモート参加	所 属		職 名	氏 名
	東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線推進本部 中央新幹線建設部 名古屋建設部		担当部長	古谷 佳久
		長野第一	担当課長	小池 一之
		長野第四	担当課長	水上 英也

【飯田市役所 A棟2階 第二委員会室】

長野県
飯田建設事務所
所長 細川 容宏

飯田市
市長 佐藤 健

(リモート参加)

東海旅客鉄道株式会社
中央新幹線推進本部 中央新幹線建設部

名古屋建設部
担当部長 古谷 佳久

名古屋建設部 長野第一
担当課長 小池 一之

名古屋建設部 長野第四
担当課長 水上 英也

モニター

飯田市 建設部
部長 米山 博樹

飯田市 建設部 国県関連事業課
参事兼課長 毛利 勇

飯田市 リニア推進部
部長 細田 仁

飯田市 リニア推進部 リニア整備課
課長 牧島 光宏

飯田市 リニア推進部 リニア用地課
課長 小倉 博明

飯田市 リニア推進部 リニア推進課
課長 下平 泰寛

東海旅客鉄道株式会社
中央新幹線推進本部 中央新幹線建設部
名古屋建設部 中央新幹線長野工事事務所
所長 平永 稔

長野県 飯田建設事務所 整備課
課長 丸山 泰正

長野県 飯田建設事務所 関連事業課
課長 柴草 真也

長野県 飯田建設事務所 用地第二課
課長 山田 俊幸

長野県 飯田建設事務所
リニア整備推進事務所 用地課
課長 松本 勇二

スクリーン

長野県 飯田建設事務所
リニア整備推進事務所
次長 北原 雅勇
長野県 飯田建設事務所
リニア整備推進事務所 調整課
課長 折井 克壽

	随行	随行	
	随行	随行	
	取材	取材	

受付


出入口

令和3年4月末時点

リニア中央新幹線 長野県内事業概要図

長野県リニア整備推進局

位置図



リニア中央新幹線
計画路線





②伊那山地トンネル(青木川工区)
非常口掘削状況 (出典:JR東海HP)



①長野県駅予定地周辺



③中央アルプストンネル(松川外工区)
ヤード整備状況 (出典:JR東海HP)

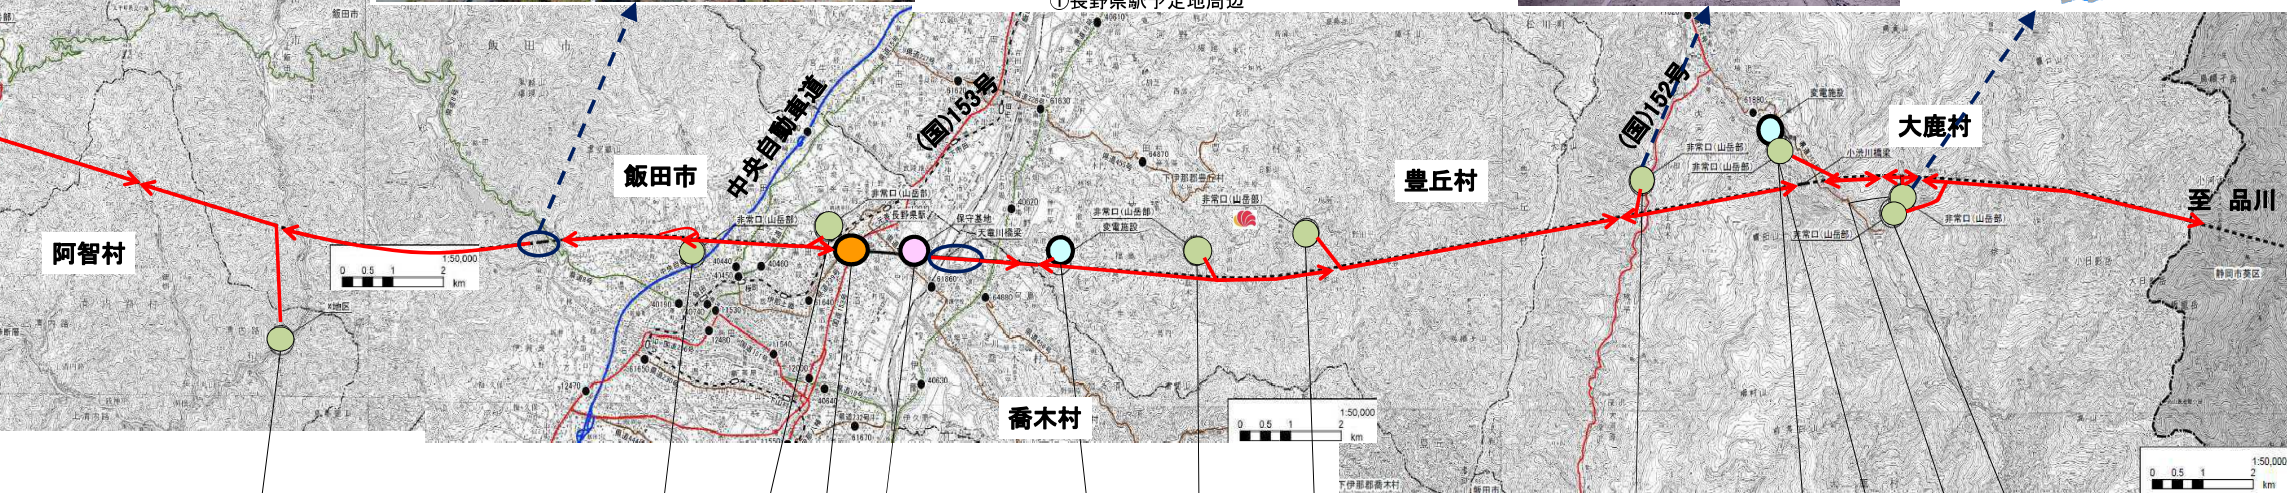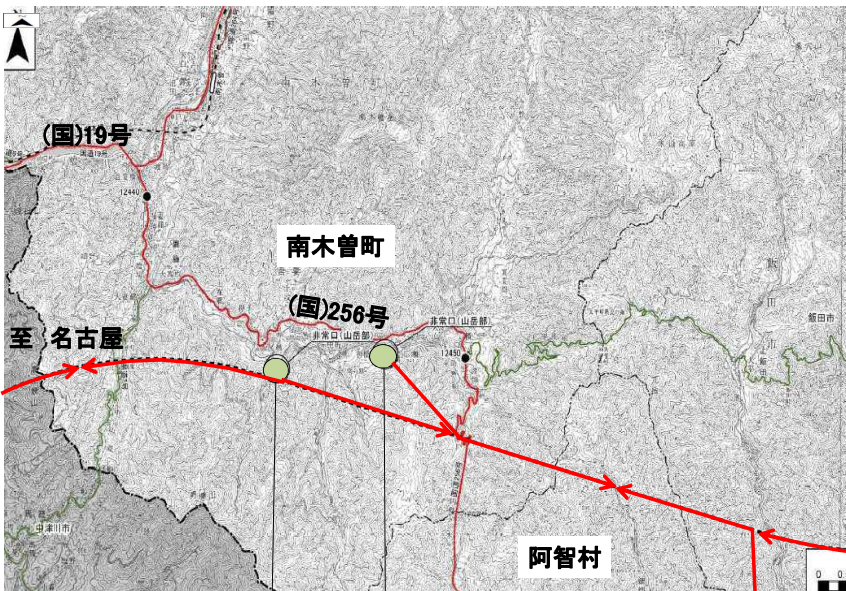

進捗状況
工事契約率:95.2%
※延長ペース:50.3km/52.9km


市町村名	岐阜県		南木曽町		阿智村		飯田市			喬木村		豊丘村		大鹿村			静岡県																				
構造物																	保守基地	豊丘変電所			小渋川変電所																
																	高架橋	天竜川橋梁 522 m	高架橋	高架橋			戸中	坂島			青木川	小渋川橋梁 171 m	小渋川	釜沢	除山						
中央アルプストンネル23,288m																長野県駅		伊那山地トンネル 15,300m																南アルプストンネル 25,019m			
風越山トンネル 5,638m																																					
工事																	保守基地	豊丘変電所						小渋川変電所					静岡工区								
	山口工区 本坑4.7km 鹿島・日本国土開発・吉川JV	⑧尾越工区 本坑6.5km 斜坑1箇所 大林・若築・株木JV		⑥萩の平・広瀬工区 本坑7.2km、斜坑2箇所 清水・三井住友・東急JV			③(松川)外工区 本坑7.2km、斜坑1箇所 戸田・あおみ・矢作JV			⑪上郷工区 本坑3.3km、立坑1箇所 大林・前田・JR東海建設・若築JV	⑩長野県駅		⑦天竜川橋梁ほか新設	⑨阿島北高架橋ほか新設	⑤戸中・壬生沢工区 本坑6.6km、斜坑1箇所 豊丘変電所 飛島・市川JV		②坂島工区 本坑5.1km、斜坑1箇所 清水・大日本土木JV		④青木川工区 本坑3.6km 斜坑1箇所 飛島・奥村組土木興業JV		①長野工区 本坑8.4km、先進坑7.8km、斜坑3箇所 鹿島・飛島・フジタJV		本坑8.9km 大成・佐藤JV														
鉄道建設・運輸施設整備支援機構発注											JR東海発注																										

凡 例
未着手
工事公告中
実施中

工区名	工事概要	受注者	工期	施行状況
①南アルプストンネル(長野工区)	本坑8.4km、先進坑1式、斜坑3箇所	鹿島・飛島・フジタJV	2016.2.9～2026.11.30	2017.4.27除山非常口掘削開始 2019.8.23小渋川非常口より先進坑掘削開始 2020.3.3釜沢非常口掘削開始
②伊那山地トンネル(坂島工区)	本坑5.1km、斜坑1箇所	清水・大日本土木JV	2016.9.29～2026.9.30	準備工施工中
③中央アルプストンネル(松川)外工区	本坑7.2km、斜坑1箇所	戸田・あおみ・矢作JV	2016.12.27～2025.5.26	準備工施工中
④伊那山地トンネル(青木川工区)	本坑3.6km、斜坑1箇所	飛島・奥村組土木興業JV	2017.8.10～2026.9.30	2020.7.17 青木川非常口掘削開始
⑤伊那山地トンネル(戸中・壬生沢工区)	本坑6.6km、斜坑1箇所、豊丘変電所造成	飛島・市川JV	2018.9.7～2026.9.30	準備工施工中
⑥中央アルプストンネル(萩の平・広瀬工区)	本坑7.2km、斜坑2箇所	清水・三井住友・東急JV	2019.2.19～2026.2.18	準備工施工中
⑦天竜川橋梁ようほか新設	橋梁約520m、高架橋約440m	三井住友・極東美和・ドービー・吉川JV	2020.7.13～2026.3.31	準備工施工中
⑧中央アルプストンネル(尾越工区)	本坑6.5km、斜坑1箇所	大林・若築・株木JV	2020.3.24～2025.11.23	準備工施工中
⑨阿島北高架橋ほか新設	高架橋約900m、トンネル約170m	飛島・神龍JV	2021.4.22～2026.3.31	2021.4.21契約
⑩長野県駅(仮称)新設	高架橋約510m、橋梁約120m、土構造約320m、その他駅付帯構造物工事	公告中	契約締結の翌日から2026.3.31まで	2020.9.30公告
⑪風越山トンネル(上郷)	本坑(シールド工法)3.3km、先進立坑、発生土搬出用仮設トンネル工事	大林・前田・JR東海建設・若築JV	2021.4.1～2026.8.31	2021.3.31契約
(参考)南アルプストンネル静岡工区	本坑8.9km	大成・佐藤JV	2017.11.16～2026.11.30	調整中
(参考)南アルプストンネル山梨工区	本坑7.7km、先進坑1式、斜坑2箇所	大成・佐藤・錢高JV	2015.8.27～2025.10.31	2017.7～先進坑の掘削
(参考)中央アルプストンネル(山口工区)	本坑4.7km、斜坑1箇所	鹿島・日本国土開発・吉川JV	2016.8.3～2022.12.2	2020.7 本坑掘削開始


種別	数 量
長野県内延長	52.9km
内訳 地上部	4.4km (約8%)
トンネル	48.5km (約92%)
駅	1箇所 (飯田市※)
保守基地	1箇所 (飯田市)
変電施設	2箇所 (大鹿村・豊丘村)
非常口	1箇所

(注)駅位置：飯田市上郷飯沼付近

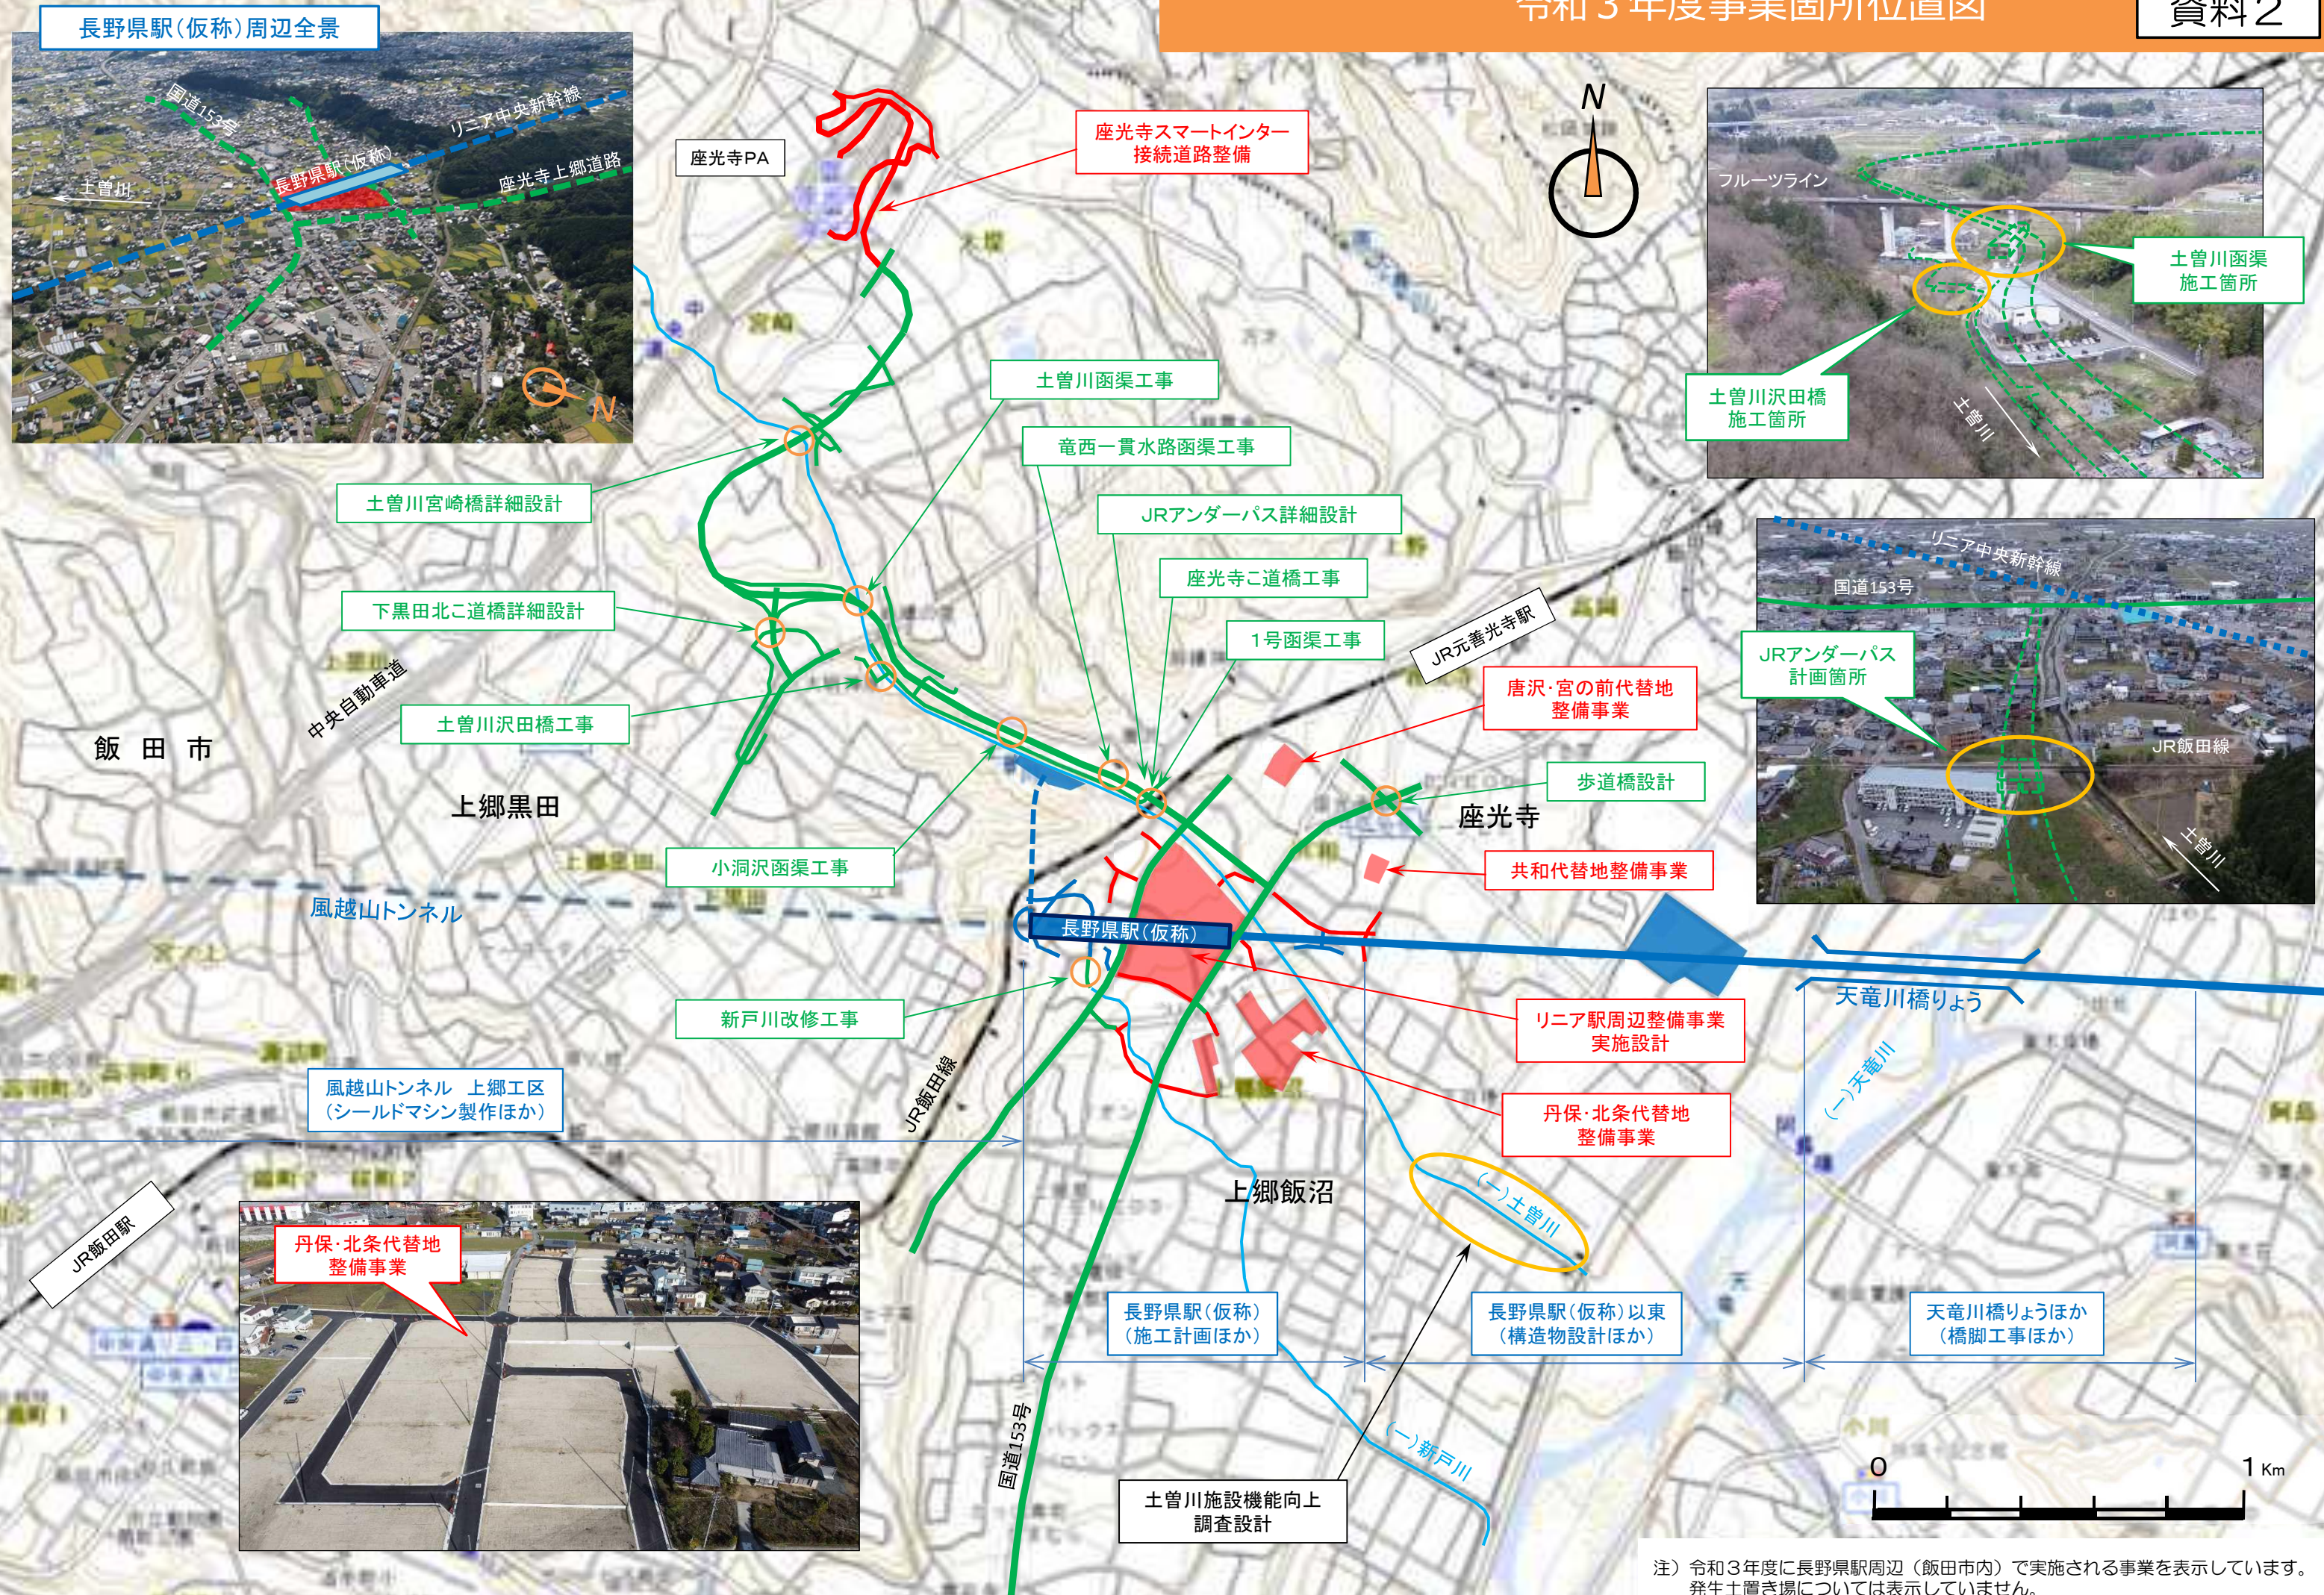

リニア中央新幹線・関連工事箇所図

資料3

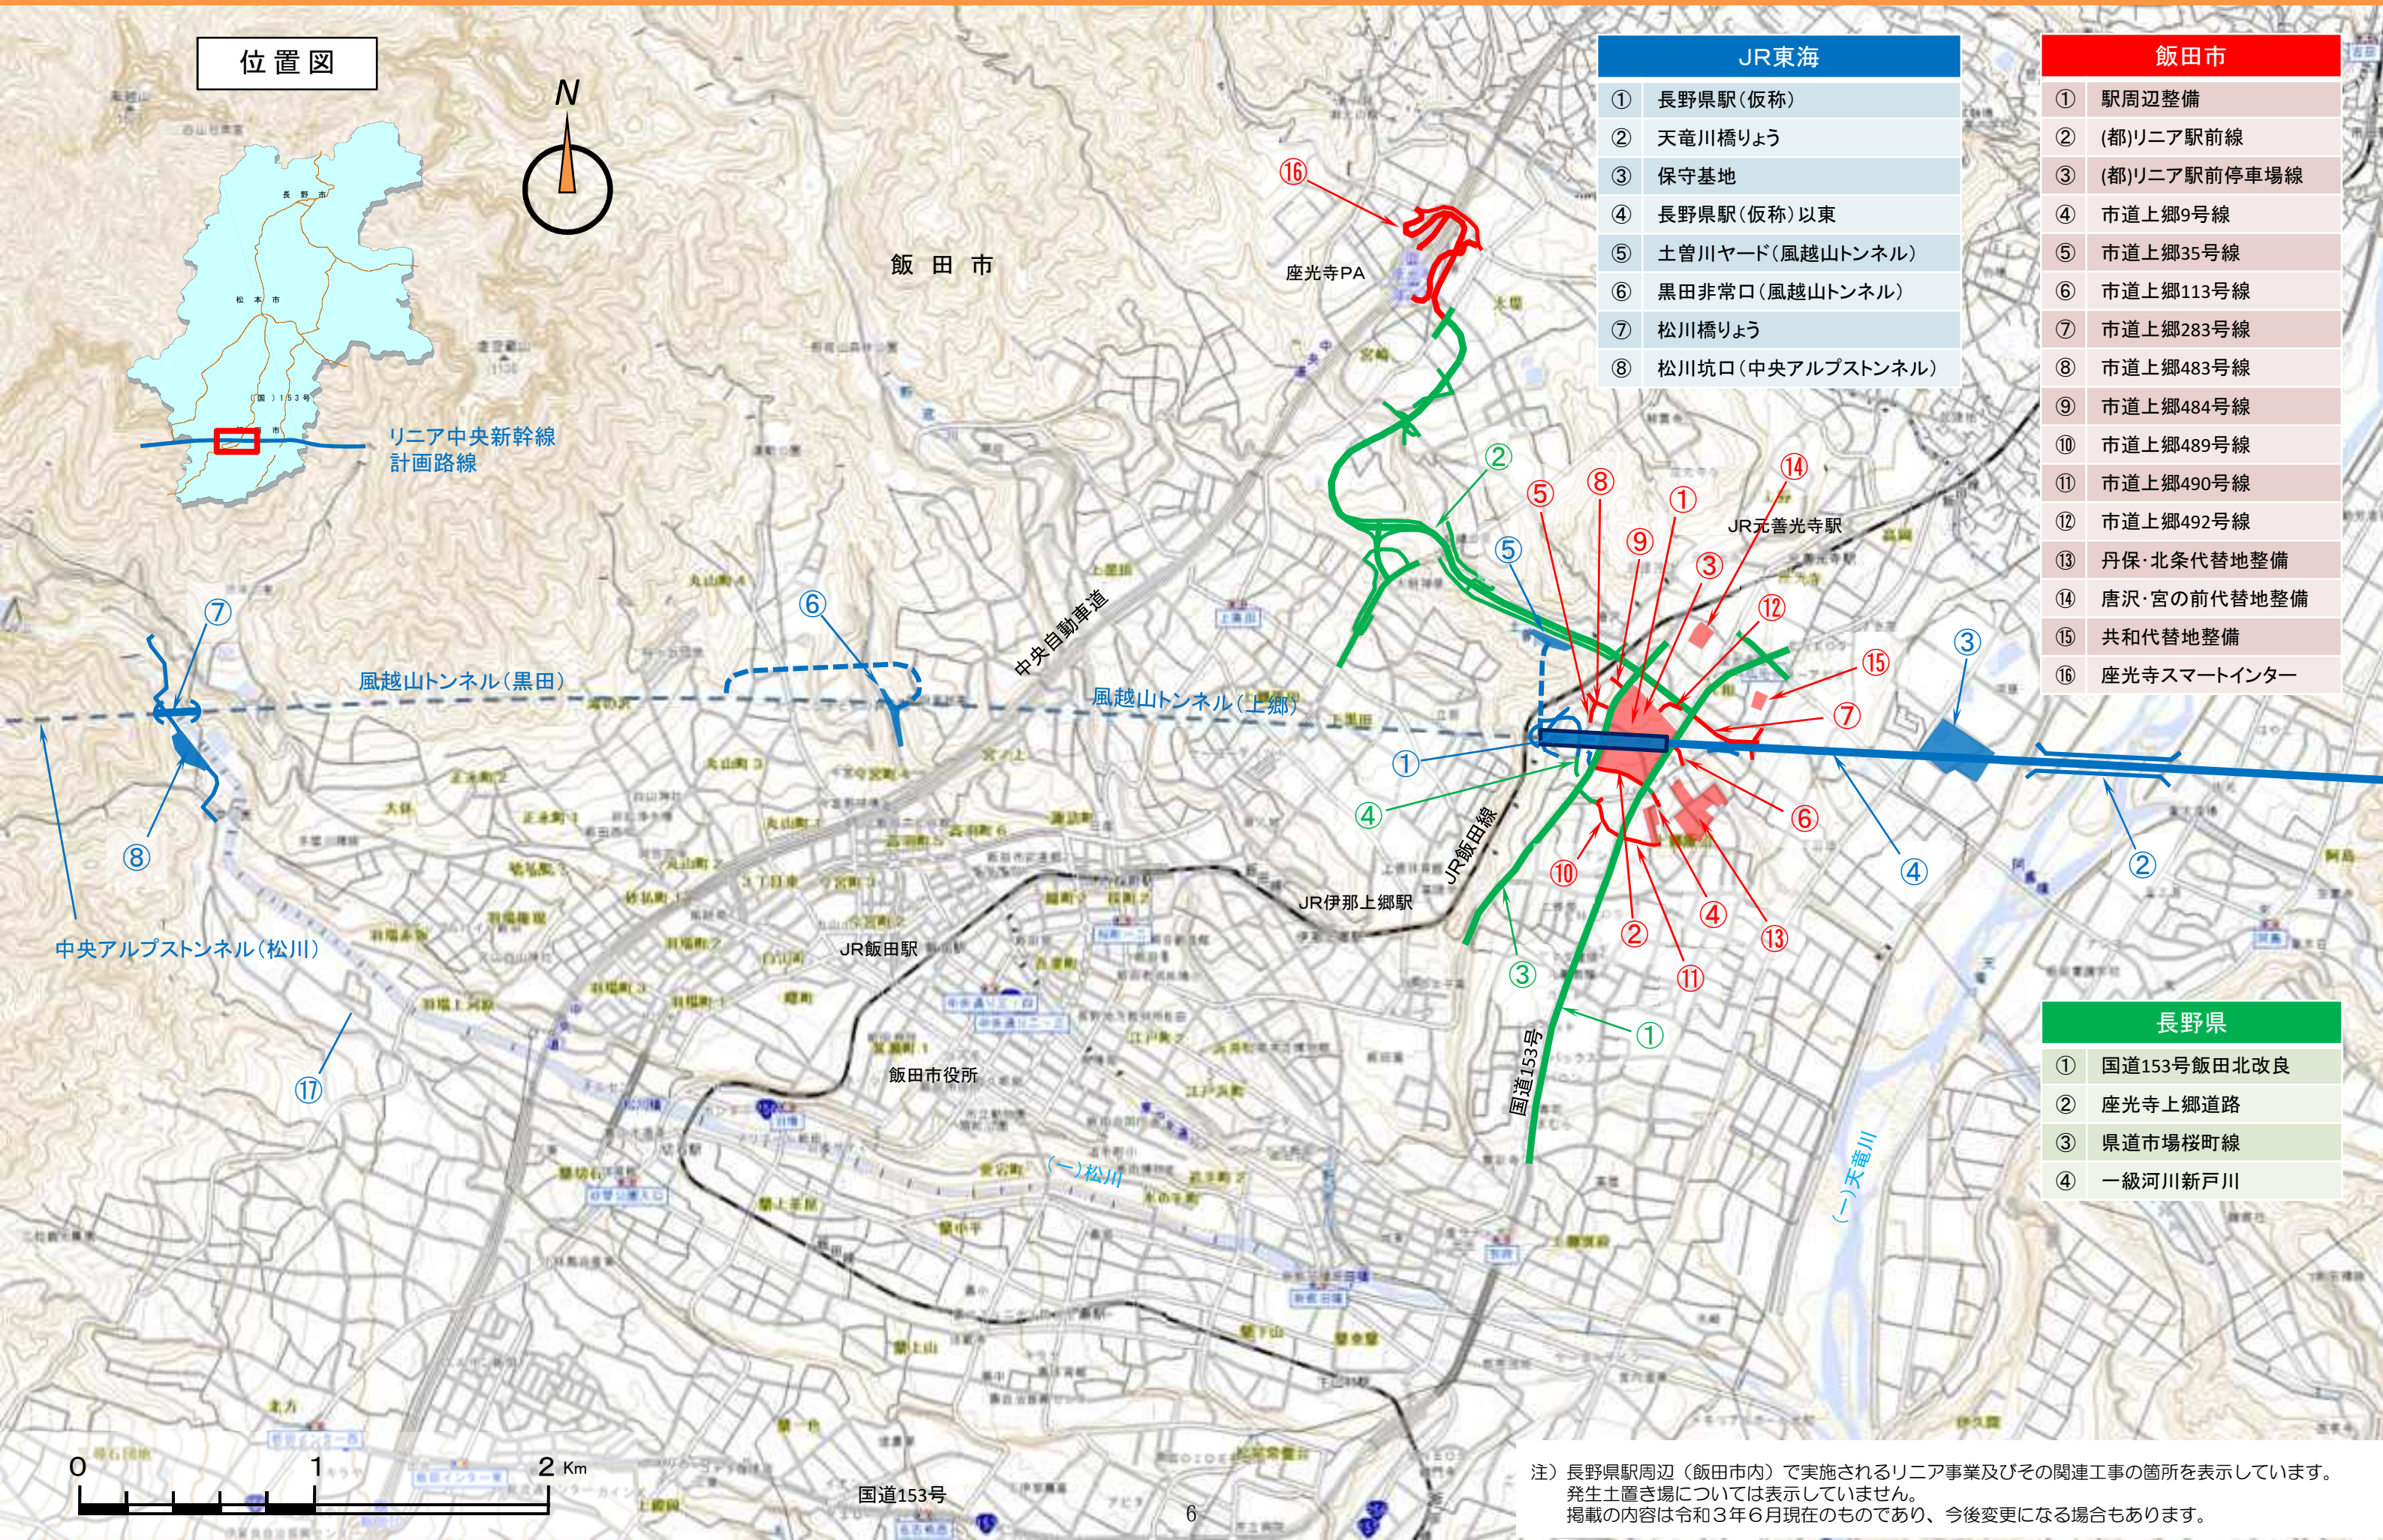

注) 長野県駅周辺(飯田市内)で実施されるリニア事業及びその関連工事の箇所を表示しています。
発生土置き場については表示していません。
掲載の内容は令和3年6月現在のものであり、今後変更になる場合もあります。

リニア本体工事及び関連工事 工程表

工程表										
事業主体	年度 項目	2020(R2)迄	2021(R3)				2022(R4)～2026(R8)	2027(R9) 以降		
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月				
JR東海	中央アルプストンネル（松川）	2018/2/15より準備工事着手				トンネル掘削工事				リニア中央新幹線 開業
	風越山トンネル（黒田）	設計・地元説明等				準備工事(ヤード整備) ⇒ トンネル掘削工事				
	風越山トンネル（上郷）	工事契約等				地質調査・施工方法検討・設計・地元説明等 ⇒ 準備工事 ⇒ トンネル掘削工事				
	発生土置き場(下久堅)	測量・設計・地元説明等				準備工事・発生土受入				
	発生土置き場(龍江)	測量・設計・地元説明等				準備工事・発生土受入				
	駅部区間	用地協議（補償金、移転先など個別協議）・契約・移転				準備工事、本体工事				
		工事契約手続き、施工計画、地元説明等 ※一部、道路付替工事				道水路付替工事（竜西一貫水路、新戸川、市道付替等）				
	高架橋区間	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転				工事着手				
	天竜川橋りょう	準備工事(喬木村側)				準備工事、本体工事				
飯田市	リニア駅周辺整備	用地物件調査				埋文調査・土木工事 運営手法の決定・建物設計 建築工事				
		土木実施設計								
		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転								
	座光寺 S I C	令和2年度供用開始	工事着手（接続道路）※工期は2027(R9)まで							
長野県	国道153号飯田北改良 （南側） （高屋交差点～北条交差点付近）	用地物件調査								
		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転								
		測量・設計（R3:道路設計）								
		工事着手								
	国道153号飯田北改良 （駅周） （北条交差点付近～座光寺上郷道路）	用地物件調査								
		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転								
		測量・設計（R3:道路設計）								
		工事着手								
	国道153号飯田北改良 （北側） （座光寺上郷道路～座光寺交差点付近）	用地物件調査								
		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転								
		測量・設計（R3道路設計・構造物設計）								
		工事着手								
座光寺上郷道路（下段）	用地物件調査									
	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転									
	測量・設計（R3：構造物設計）									
	工事着手									
座光寺上郷道路（上段）	用地物件調査									
	用地協議(個別協議)・契約・移転									
	測量・設計（R3：構造物設計）									
	工事着手									
県道市場桜町線	用地物件調査									
	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転									
	測量・設計（R3:構造物設計）									
	工事着手									
飯田市	新戸川	用地物件調査								
		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転								
		測量・設計				工事着手				
飯田市	代替地整備(丹保北条地区)	造成工事	1工区完成	2工区完成	道路工事					
			丹保北条代替地へ 移転可能							
	代替地整備(唐沢宮の前地区)	造成工事	分譲区画完了	道路工事				完		
				造成工事				成		
	代替地整備(共和地区)	測量・設計	用地協議	造成工事				完		
				共和地区代替地へ移転可能				成		

リニア中央新幹線 開業

※工程表スケジュールは現時点（2021年5月）のものであり、今後変更となる可能性があります。7

■ J R 東海発注工事

令和 3 年 6 月時点

名 称	工 期	発注者		受注者			備 考
		発注事業者名	連絡先	業者名	現場事務所住所	電話番号	
中央新幹線天竜川橋りょうほか新設	R2.7.14 ～ R8.3.31	J R 東海 中央新幹線長野工事事務所	0265-38-6500	三井住友建設（株）・極東興和（株）・ドーピー建設工業（株）・吉川建設（株）特定建設工事共同企業体	長野県下伊那郡喬木村1434	0265-48-6704	住所及び電話番号は仮事務所のため、今後変更となります。
中央新幹線、風越山トンネル（上郷）	R3.4.1 ～ R8.8.31	独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備機構 飯田鉄道建設所	0265-53-1755	中央新幹線、風越山トンネル（上郷）特定建設工事共同企業体（大林組（株）・前田建設工業（株）・ジェイアール東海建設（株）・若築建設（株））	未定	未定	J R 東海は、本工事を独立行政法人鉄道建設・運輸機構に委託しています。

■長野県発注工事

名 称	工 期	発注者		受注者			備 考
		発注事業者名	連絡先	業者名	現場事務所住所	電話番号	
令和2年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事 (主)飯島飯田線・(一)上飯田線 飯田市 座光寺上郷道路	2021.3.3～2023.9.19	長野県飯田建設事務所 関連事業課	0265-53-0496	木下建設(株)	(会社) 飯田市松尾町1-22	0265-22-2780	座光寺上郷道路

■飯田市発注工事

名 称	工 期	発注者		受注者			備 考
		発注事業者名	連絡先	業者名	現場事務所住所	電話番号	
令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事 市道上郷108号線ほか 飯田市上郷飯沼	2020.8.11～2021.8.31	飯田市	0265-22-4511	北沢建設株式会社	(会社) 飯田市吾妻町7	0265-23-0072	丹保北条地区道路整備工事
令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事 市道座光寺95号線 飯田市座光寺	2020.8.26～2021.6.30	飯田市	0265-22-4511	小木曽建設株式会社	(会社) 飯田市座光寺6663-5	0265-22-8022	唐沢宮の前地区道路整備工事
令和2年度 リニア代替地整備事業 代替地造成工事 丹保北条地区（ブロックA） 飯田市上郷飯沼	2020.10.12～2021.6.30	飯田市	0265-22-4511	北沢建設株式会社	(会社) 飯田市吾妻町7	0265-23-0072	丹保北条地区代替地造成工事等
令和2年度 リニア代替地整備事業 代替地造成工事 唐沢宮の前地区 飯田市座光寺	2020.8.13～2021.7.30	飯田市	0265-22-4511	株式会社トライネット	(会社) 飯田市松尾代田573-1	0265-24-9320	唐沢宮の前地区代替地造成工事
令和3年度 リニア代替地整備事業 代替地整備工事 丹保北条地区代替地 飯田市上郷飯沼	2021.5.6～2021.7.30	飯田市	0265-22-4511	大喜建設株式会社	(会社) 飯田市松尾代田866-3	0265-24-8623	丹保北条地区代替地緑化工事等
令和3年度 リニア代替地整備事業 代替地整備工事 唐沢宮の前地区代替地 飯田市座光寺	2021.4.26～2021.7.30	飯田市	0265-22-4511	株式会社トライネット	(会社) 飯田市松尾代田573-1	0265-24-9320	唐沢宮の前地区代替地造成工事
