


- ・工事期間中の環境管理を適切に行うため、工事の最盛期に建設機械の稼働及び工事用車両の運行に伴う大気質、騒音、振動の計測を行います。



簡易計測例

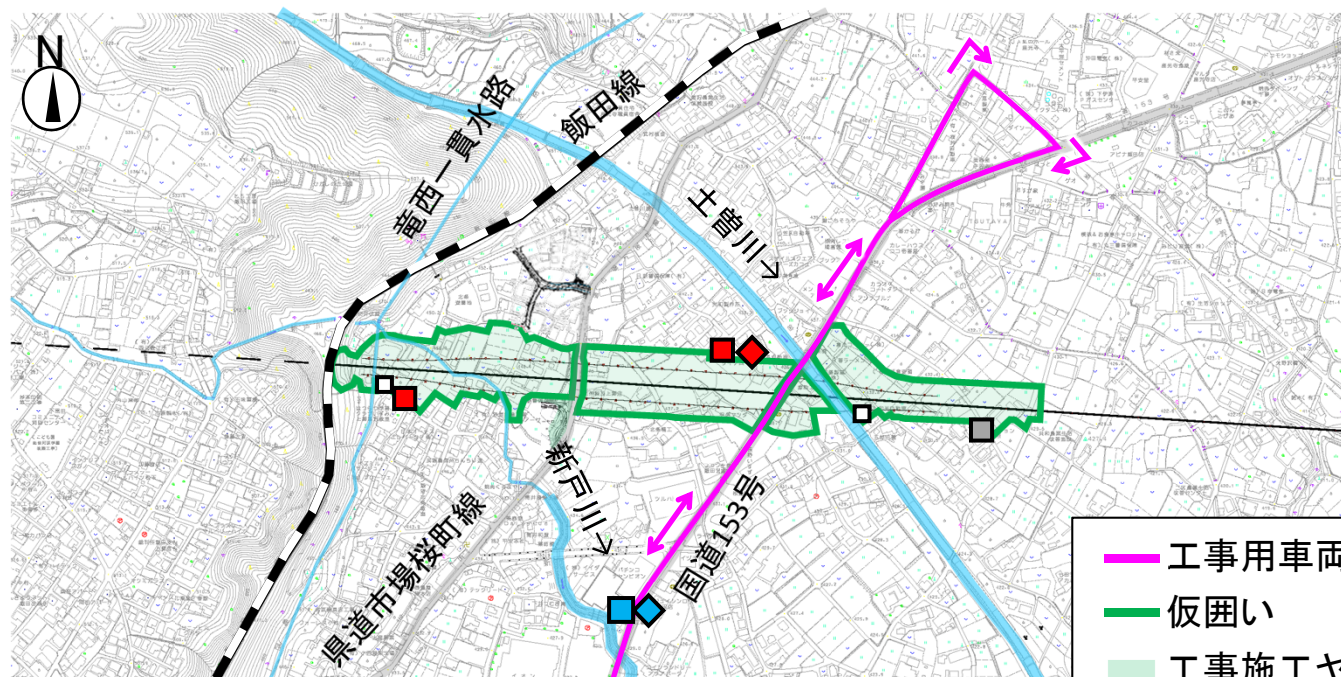


調査項目		調査頻度
◆ ◆ 大気質	二酸化窒素、 浮遊粒子状物質、 粉じん等	工事最盛期に1回 (四季調査)
■ ■ 騒音・振動		工事最盛期に1回

- 工事用車両ルート
- 仮囲い
- 工事施工ヤード
- ◆ 建設機械のモニタリング地点(大気質)
- 建設機械のモニタリング地点(騒音・振動)
- ◆ 沿道のモニタリング地点(大気質)
- 沿道のモニタリング地点(騒音・振動)
- 建設機械のその他調査地点(騒音・振動)
- 簡易計測地点(騒音・振動)

※状況に応じて調査期間、頻度及び地点について変更する可能性があります。

※モニタリングとは別に、その他調査として、騒音・振動の計測を実施します。

- ・工事中の環境管理を適切に行うため、水質及び水資源(井戸)のモニタリングを実施します。

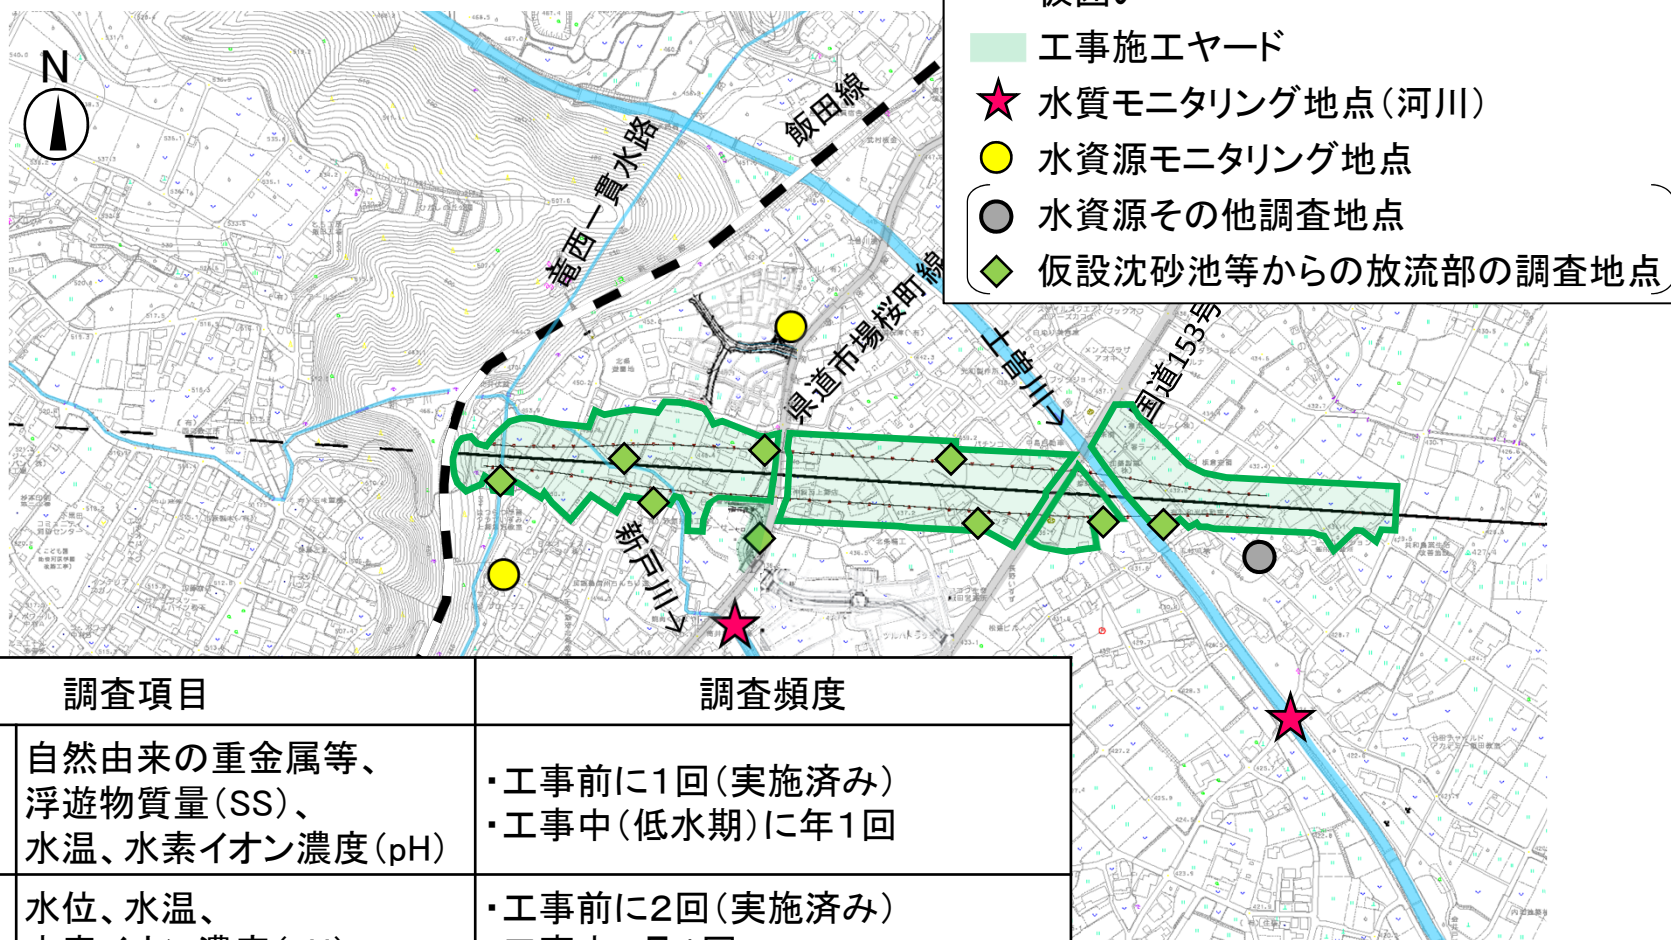


調査項目		調査頻度
★ 水質	自然由来の重金属等、 浮遊物質(SS)、 水温、水素イオン濃度(pH)	・工事前に1回(実施済み) ・工事中(低水期)に年1回
● 水資源 (井戸)	水位、水温、 水素イオン濃度(pH)、 電気伝導率、透視度	・工事前に2回(実施済み) ・工事中、月1回 ・工事完了後、一定の期間

※工事施工ヤードから公共用水域へ放流する工事排水は、浮遊物質(SS)、水素イオン濃度(pH)等を◆で測定します。
 ※水質(河川水)のモニタリング結果が環境基準を超える等の異常が確認された場合は、必要に応じて土曾川等への放流地点の上流側を含めて再測定を実施します。

- モニタリングの結果の質問等につきましては、JR東海（中央新幹線長野工事事務所）までお問い合わせください。
- 上記の結果や環境保全措置の実施状況については、事業者の取組として年度毎にとりまとめ、長野県及び関係自治体へ報告します。
- 結果を受け、異常値が認められた場合は速やかに長野県及び関係自治体等へ報告し、対応策を講じます。
- また、必要な場合には、環境保全措置の追加や変更を実施します。
- 環境保全措置の追加や変更がある場合は、影響が及ぶ可能性のある地域にお住まいの方々などに、あらかじめご説明します。

- ・土曾川橋りょう基礎の中詰め材として要対策土を活用することに伴い、モニタリングとは別に水資源の調査を実施します。

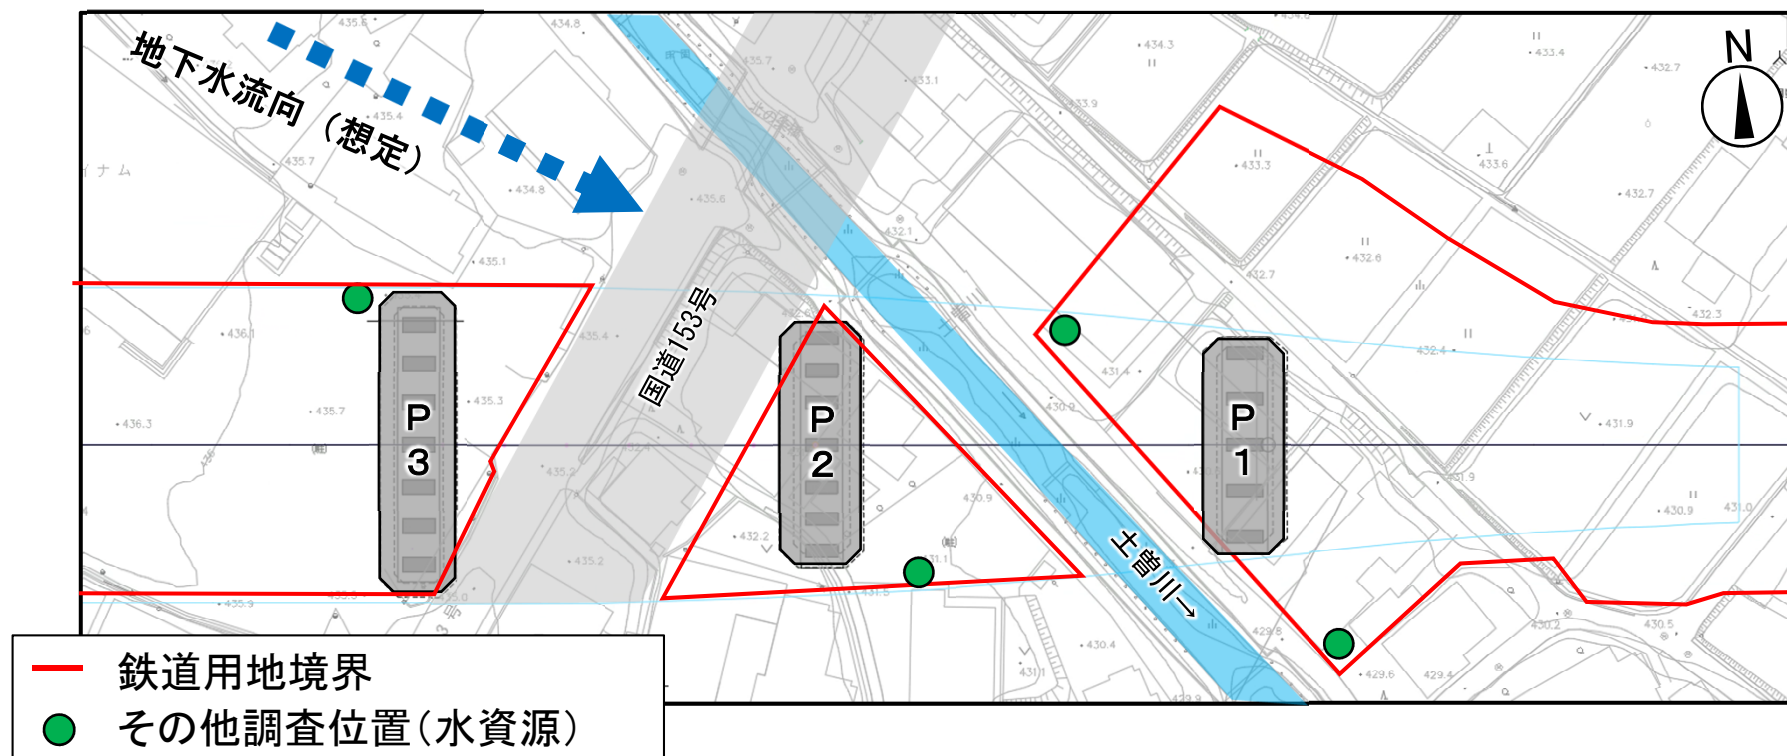

調査項目		調査頻度
● 水資源 (井戸)	水素イオン濃度(pH)、水温、 水位、電気伝導率、 自然由来の重金属等	・中詰め材投入前は1年前から四半期に1回を原則とする ・中詰め材投入中、月1回 ・中詰め材投入完了後、月1回※ ※調査期間、頻度は、調査結果等を踏まえ検討してまいります。

工事の進捗状況等のお知らせ

- 工事の進捗状況や交通規制等の情報については、月に1度の頻度で発行している「工事だより」にてお知らせしていきます。
- 工事だよりは組合回覧のほか、次の施設で自由にお取りいただけるようにいたします。
- なお、北条振興センターは、入り口付近に常時掲示することを考えております。

長野県県（仮称）新設・風越山トンネル（上郷）
工事だより

2024年6月号（Vol.19）

組合回覧

上郷地区にお住まいの皆様へ

清水建設株式会社
中央新幹線・風越山トンネル（上郷）特定建設工事共同企業体

拝啓 梅雨の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、長野県県（仮称）新設工事では、土曾川横りょう東側橋脚工事や電西一貫水路工事、駅部準備作業を6月も引き続き行います。また、市道上郷5号線付替工事にも着手していきます。今後の工事につきましても、安全・環境に対して十分に配慮しながら進めてまいります。
何かお気づきの点がございましたら、お問合せ先までご連絡いただけますと幸いです。

敬具

■直近の主な工事予定

○土曾川横りょう東側橋脚工事	：橋脚基礎工事	R5.3～R6.10（予定）
○電西一貫水路工事	：サイフォン構築工事 [※]	R5.10～R7.3（予定）
○市道上郷5号線付替工事（南側区間）	：ヤード造成工事 [※]	R6.6～R7.4（予定）
○駅部準備作業	：ヤード造成工事 [※]	R6.4～R7.4（予定）

※残量基礎の解体作業・土砂搬出を含む

■土曾川横りょう東側橋脚工事に関して

土曾川横りょう工事において、橋脚基礎工事を引き続き行います。車両の交通規制については、裏面②のとおりです。また、一昨年の工事説明会でもご説明しているとおり、早朝・夜間を含めたコンクリート打設を7月初旬以降、月に数回程度行います（計画は7/3（水）を予定）。工事時間は6時～20時頃までの作業を予定しております。周辺の居住環境や交通状況に配慮しながら作業を進めてまいります。工事期間中は、ご不便をお掛けしますが、ご理解の程、お願い申し上げます。

■電西一貫水路工事に関して

電西一貫水路工事に伴い、掘削（深さ約14m）箇所ではマンホール・配管の設置等のサイフォン構築工事を行います。

■市道上郷5号線付替工事（南側区間）に関して

市道上郷5号線付替工事（南側区間）に伴い、ヤード造成工事を進めます。

■駅部準備作業に関して

駅部準備作業に伴い、国道153号から県道市場坂町線までの工事用道路周辺で、残量基礎の解体等のヤード造成工事を進めます。

■工事場所と工事用車両の運行

工事用車両は、裏面の「工事場所と工事用車両の運行図」の赤色ルートで運行いたします。
工事用車両運行時は市場坂町線横断箇所には誘導員を配置し、通学児童には特に注意いたします。
○運行時間帯：8時00分～18時00分[※]
○コンクリートの打設作業時は6時00分～20時00分頃まで運行
計画は7/3（水）を予定しておりますが、天候や工事の進捗により日時が変更になる場合がございます。
○休工日：日曜日、その他（GW、夏季休暇、年末年始休暇等）

工事場所と工事用車両の運行図

市場坂町線の横断通行に関して

交通規制に関して

① 拡大図

② 拡大図

市場坂町線・上郷5号線・上郷33号線の横断通行について
大型車両は工事用道路を通行し、県道市場坂町線・上郷5号線・上郷33号線を横断通行
② 土曾川横りょう東側橋脚下部工構築に伴う交通規制について
【市道座光寺88号線】R5.6月13日より、通行止め
【河川管理用道路（座光寺側）】R5.9月19日より、通行止め（車両のみ）、歩行者通行可
期間中はご不便をお掛けしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いたします。

○お問合せ先

◆長野県県（仮称）新設◆
清水建設株式会社
住所 長野県飯田市上郷飯沼 777-1
電話 0265-42-0391

◆風越山トンネル（上郷）◆
中央新幹線・風越山トンネル（上郷）
特定建設工事共同企業体
住所 長野県下伊都郡下郷村穂沢 208
電話 0265-31-0083

【設置場所】

飯田市役所、北条振興センター、座光寺公民館、上郷公民館

◆森の里親協定 …大鹿村・伊那市と締結し、両自治体の森林整備活動を支援

◆ゼロカーボンデー … 飯田線を実質CO2排出ゼロで運行する日にイベントを実施



森林CO2 認証式@長野県庁



大鹿村特産品の販売@飯田駅

◆当社サイト「リニアでつながるまち」 … リニア中央新幹線の沿線地域の魅力を発信

◆当社サイト「conomichi」 … 地域の社会課題を個性とし、関係人口創出に貢献



「リニアでつながるまち」の長野県ページ



放置竹林を活かしたワークショップ@飯田
