

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29年6月12日

計画の名称	飯田市都市公園長寿命化対策事業（防災・安全）		
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）	交付対象	長野県飯田市
計画の目標			

本市の都市公園は開設時期の古い公園が多く、公園施設の老朽化が進んでいる。その為、都市公園長寿命化計画を策定し、施設の長寿命化対策や計画的な改築・更新を図る。
また、計画に基づき、安全で安心して利用できる公園施設整備を推進する為、必要な施設の改築・更新を「飯田市都市公園長寿命化対策事業（防災・安全）」により整備する。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 公園長寿命化計画策定の必要な公園数35公園を平成25年度までに総て策定する。 改修の必要な公園数35公園のうち16公園を平成28年度までに改修する。 		
----------------	---	--	--

定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考			
						当初現況値	中間目標値	最終目標値				
						(H24当初)	(H26末)	(H28末)				
公園施設長寿命化計画策定公園の割合（％） 計画策定の割合 = 計画策定済み公園数 / 計画策定の必要な公園数（％）					0%	100%	100%	長寿命化計画策定（H26末） 35箇所				
改築・更新の必要な公園の対策済み公園の割合（％） 対策済みの割合 = 改築・更新済み公園数 / 改築・更新必要な公園数（％）					0%	75%	100%	改築・更新済み公園数（H26末） 12公園 改築・更新済み公園数（H28末） 16公園				
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	134百万円	A	134百万円	B	—	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

事後評価												
○事後評価の実施体制、実施時期												
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期						
本事業を主管する飯田市建設部土木課において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証するとともにその要因を分析した。						平成29年6月						
						公表の方法						
						飯田市ホームページにて公表						

1. 交付対象事業の進捗状況

A6 都市防災・公園事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
									H24	H25	H26	H27	H28			
1-A-1	公園	一般	飯田市	直接	飯田市	飯田市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画策定（35箇所） 安全安心対策（矢高中央公園等7箇所 における遊戯施設の改築） 長寿命化対策（風越山麓公園等7箇所 における遊戯施設、便所等の改築）	飯田市						134	策定済	長寿命化計画 （11百万円） 安全安心対策 （33百万円） 長寿命化対策 （90百万円）
小計（都市防災・公園事業）												134	—			

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

C 効果促進事業															
C6 都市防災・公園事業効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29年6月12日

計画の名称	飯田市都市公園長寿命化対策事業（防災・安全）															
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）	交付対象	長野県飯田市													
計画の目標	本市の都市公園は開設時期の古い公園が多く、公園施設の老朽化が進んでいる。その為、都市公園長寿命化計画を策定し、施設の長寿命化対策や計画的な改築・更新を図る。また、計画に基づき、安全で安心して利用できる公園施設整備を推進する為、必要な施設の改築・更新を「飯田市都市公園長寿命化対策事業（防災・安全）」により整備する。															
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H24	H25	H26	H27	H28			
										合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況					<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画を策定したことにより、公園施設の耐用年数の延伸とライフサイクルコストの削減を図るための体制が整い、計画的な施設の更新・改築が可能となった。 公園施設長寿命化計画に基づき、16公園の施設を更新・改築を行い、安全で安心して利用できる公園施設とするための整備を推進することができた。 				
II 定量的指標の達成状況	指標① 公園施設長寿命化計画策定公園の割合（%）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因					
		最終実績値	100%						
	指標② 改築・更新の必要な公園の対策済み公園の割合（%）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因					
		最終実績値	100%						
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)									
3. 特記事項（今後の方針等）									
<ul style="list-style-type: none"> 定期点検、日常点検により公園施設の安全性を維持するとともに、公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な施設の更新・改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保を図っていく。 									


都市公園

計画の名称	1 飯田市都市公園長寿命化対策事業 (防災・安全)	交付対象	飯田市
計画の期間	平成24年度 ~ 平成28年度 (5年間)		

1-A-1 飯田市公園施設長寿命化計画調査 35箇所

1-A-1

種類	No.	番号	公園名	開設面積 (ha)
街区	1	2.2.1	高羽1号公園	0.20
	2	2.2.2	高羽2号公園	0.17
	3	2.2.3	今宮公園	0.20
	4	2.2.4	大王路公園	0.10
	5	2.2.5	江戸町公園	0.20
	6	2.2.6	東栄公園	0.20
	7	2.2.7	城東1号公園	0.20
	8	2.2.8	丸山1号公園	0.13
	9	2.2.9	上溝公園	0.16
	10	2.2.10	弁天公園	0.20
	11	2.2.11	神明公園	0.14
	12	2.2.12	天竜峡公園	0.20
	13	2.2.13	西郷公園	0.20
	14	2.2.14	城東2号公園	0.30
	15	2.2.15	城東3号公園	0.20
	16	2.2.16	丸山2号公園	0.12
	17	2.2.17	白山1号公園	0.36
	18	2.2.18	白山2号公園	0.12
	19	2.2.19	明公園	0.18
	20	2.2.20	大井公園	0.19
	21	2.2.21	青良公園	0.18
	22	2.2.22	北方公園	0.80
	23	2.2.23	羽場1号公園	0.10
	24	2.2.24	羽場2号公園	0.12
近隣	25	3.3.1	計	24公園 4.97
	26	3.3.2	中央公園	1.80
	27	3.3.3	滝の沢公園	0.50
	28	3.3.4	矢高中央公園	2.20
	29	3.3.5	羽場公園	1.17
地区	30	4.4.1	計	4公園 5.67
	31	4.4.2	扇町公園	4.40
	32	4.4.3	八幡公園	0.80
	33	4.5.3	松尾鈴岡公園	8.71
総合	34	5.5.1	計	3公園 13.91
	35	5.5.2	風越山麓公園	13.91
特殊	36	7.5.1	計	2公園 33.30
	37	7.5.2	風越公園	13.70
緑地	38	7.5.3	計	1公園 13.70
	39	7.5.4	松川緑地	2.70
			合計	35公園 74.25

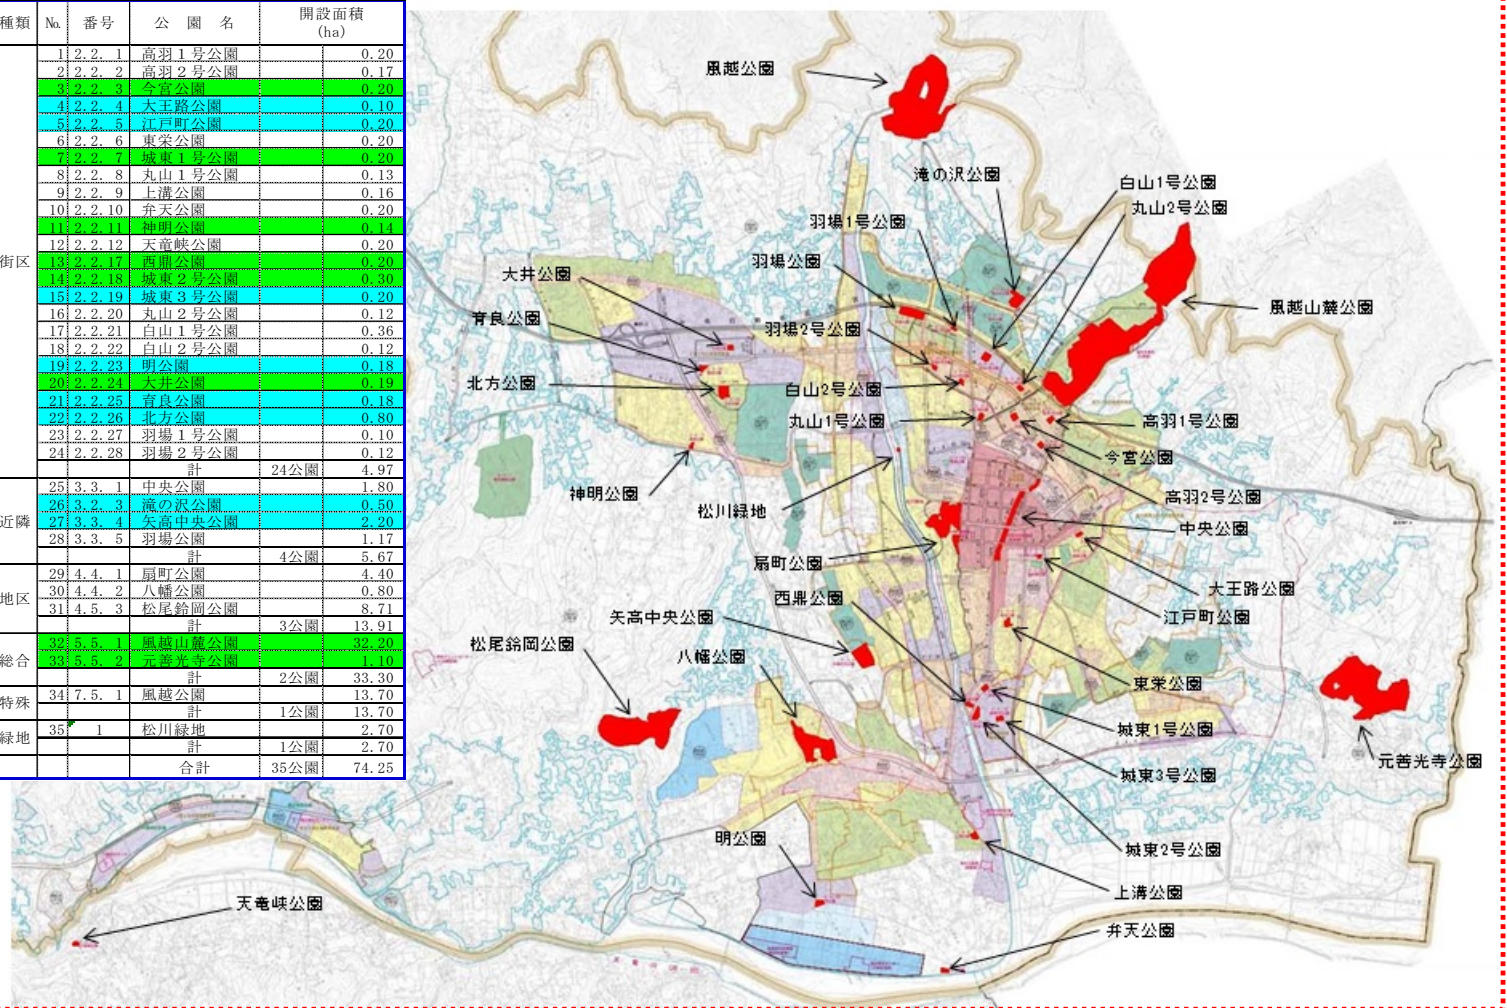

凡例	
1-A-1	公園施設長寿命化計画
1-A-2	飯田市都市公園安全・安心対策緊急支援事業
1-A-3	飯田市都市公園長寿命化修繕事業(防災・安全)

1-A-2	飯田市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	8公園
1-A-3	飯田市都市公園長寿命化対策事業(防災・安全)	8公園
