

3. リニア駅前広場整備

◎令和7年度実施内容

- ・令和7年度は、埋蔵文化財発掘調査や駅前広場整備に向けた各種土木工事、植栽計画の策定を予定しています。
- ・建築関係では大屋根の建築に向けた木材調達や、駅前広場内の公共施設(管理棟・トイレ等)の設計を行い、土木・建築の両面から整備を進めてまいります。

駅前広場 整備

●土木・建築関係

- ・埋蔵文化財発掘調査
- ・土曾川横断道路橋梁架設工事
- ・北側調整池整備工事
- ・北側および南側の造成工事
- ・大屋根の木材調達
- ・公共施設の施設内容検討、決定、設計



埋蔵文化財発掘調査

●植栽計画の策定

- ・樹種の選定
- ・3Dシミュレーションを用いた検討



多様な木々を結ぶイメージ

●景観形成に向けた検討

- ・駅舎や街並のデザイン形成に向けた検討

交通 エネルギー

●利便性の高い交通体系の検討

- ・駐車場システム、カーシェア、レンタカー等の導入に向けた研究

●新たな交通システムの検討


- ・自動運転の実装に向けた研究



提供：信州大学

●再エネ・省エネの検討

- ・再生可能エネルギーの導入方針・手法の検討
- ・グリーン水素・水循環技術の導入方針・手法の検討

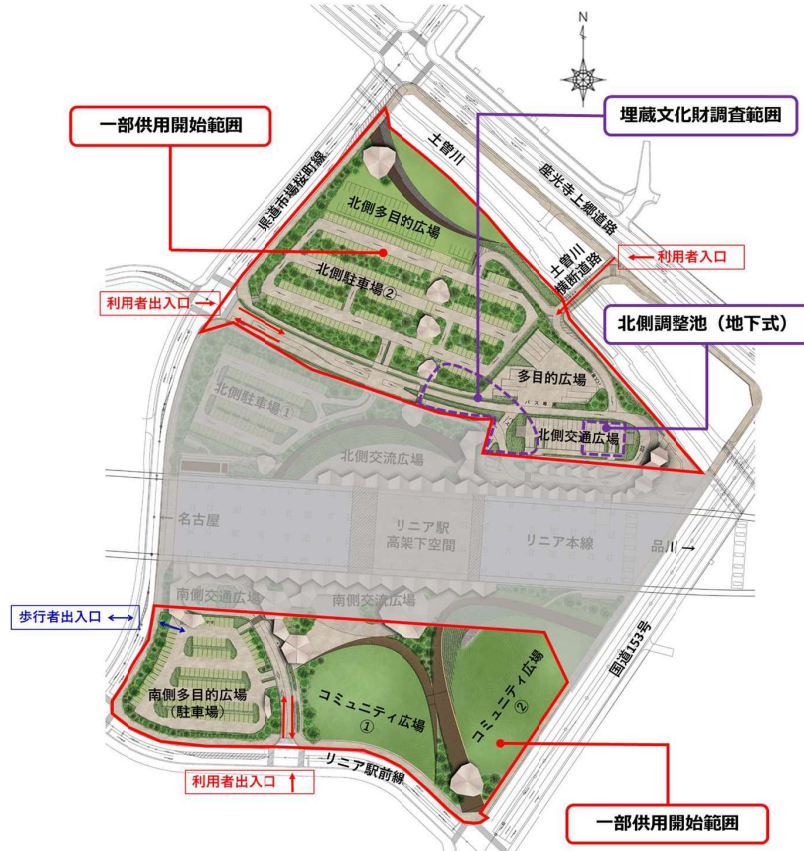

※一部供用開始範囲の完成図はイメージです。

工程表

※工程表スケジュールは現時点（2025年3月）のものであり、変更となる可能性があります。

事業主体	項目	年度	2024(R6)迄	2025(R7)				2026(R8)～		
				4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月			
飯田市	駅前広場整備	用地取得		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転					2028年度 一部供用開始	リニア中央新幹線 開業
		土木関係		埋蔵文化財発掘調査						
				土曾川横断道路橋梁架設工事						
				北側調整池整備工事						
				北側・南側造成工事						
		グリーンインフラ		緑化駐車場や南側調整池の土木工事						
	交通エネルギー	建築関係	大屋根実施設計	木材調達				建築工事		
			公共施設の条件整理	施設内容検討・決定・設計				建築工事		
		景観形成		環境・景観配慮指針(案)協議				環境・景観配慮指針運用		
		交通体系		駐車場システム、カーシェア、レンタカー等の導入に向けた研究						
	交通エネルギー	新交通システム		自動運転の実装に向けた研究						
		再エネ・省エネ		リニア開業に向けた再生可能エネルギーの導入方針・導入手法の検討						
				グリーン水素・水循環技術の駅前広場整備への導入方針の検討						

4. リニア関連道路事業

座光寺スマートIC接続道路


座光寺スマートICと座光寺上郷道路を結ぶ道路の整備を実施します。

- ・事業延長：約0.6km（本線約0.3km）
- ・2025年度の主な工事内容：道路の新設工事の実施

県道市場桜町線

中心市街地とリニア駅を結ぶ道路の整備を実施します。

- ・事業延長：約1.4km
- ・2025年度の主な工事内容：道路の拡幅工事の実施
橋りょう下部工事(※1)の実施

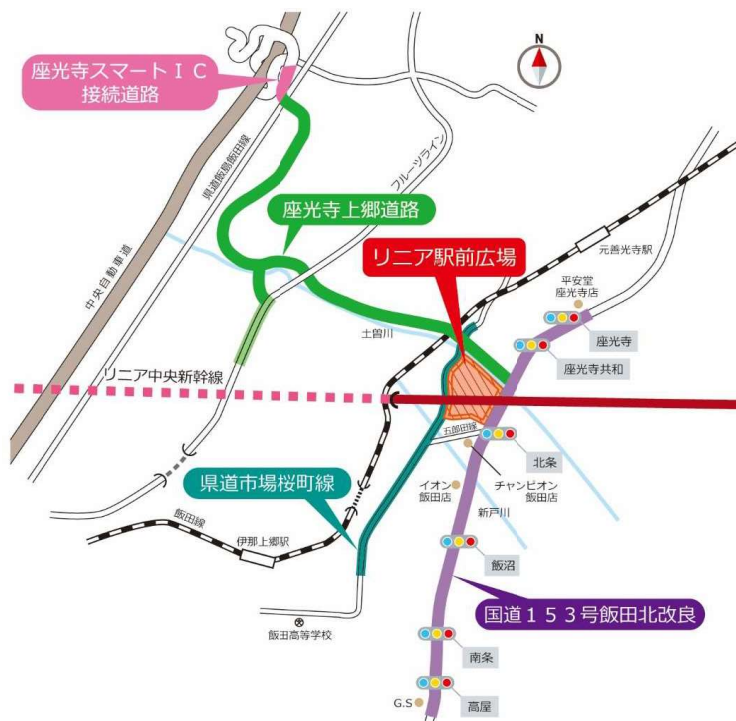

座光寺上郷道路

リニア駅と座光寺スマートICを結ぶ道路の整備を実施します。

- ・事業延長：約3.2km
- ・2025年度の主な工事内容：JR飯田線の下を通る道路新設工事の実施（アンダーパス工事）
枅ヶ洞川等の函渠工事(※2)の実施
市道の付替え工事を含めた道路の新設工事の実施

国道153号 飯田北改良

高屋交差点から座光寺交差点までの国道153号の道路の整備を実施します。

- ・事業延長：約2.6km
- ・2025年度の主な工事内容：飯沼交差点から北条交差点周辺の道路の拡幅工事の実施
橋りょうの下部工事(※1)の実施
座光寺交差点付近で道路を横断するための横断歩道橋工事の実施

(※1) 下部工事：橋りょうの土台となる橋台及び橋脚を構築する工事

(※2) 函渠工事：横断面が四角形のトンネル河川を構築する工事

工程表

※工程表スケジュールは現時点（2025年3月）のものであり、変更となる可能性があります。

事業主体	年度 項 目	2024(R6)迄	2025(R7)				2026(R8)～			
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月				
長野県	国道153号飯田北改良（南側） 高屋交差点～北条交差点付近		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転							
			高屋交差点～南条交差点 埋文調査							
			道路築造工事							
			飯沼交差点～北条交差点周辺 道路築造工事							
	国道153号飯田北改良（駅周） 北条交差点付近～座光寺上郷道路		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転							
			北条交差点周辺 道路築造工事							
			橋りょう下部工（左岸）、盛土工事							
	国道153号飯田北改良（北側） 座光寺上郷道路～座光寺交差点付近		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転							
			座光寺横断歩道橋架設工事、県道拡幅工事							
	座光寺上郷道路（上段） 県道飯島飯田線～フルーツライン		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転							
飯田市			埋文調査							
			橋りょう架設工事、函渠工事、道路築造工事、市道付替工事							
	座光寺上郷道路（下段） フルーツライン～国道153号		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転							
			県道市場桜町線～国道153号 埋文調査							
			JRアンダーパス工事、道路築造工事、函渠工事							
	県道市場桜町線（駅周～五郎田線）		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転							
			道路築造工事、橋りょう工事、箱型函渠工事							
	県道市場桜町線（五郎田線以南）		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転							
			道路築造工事、市道付替工事							
	座光寺スマートIC接続道路		道路築造工事							

リニア中央新幹線 開業

前年度（2024年度）の主な事業内容

1. リニア本線関係

◆ 中央アルプストンネル（松川工区）



本線トンネル掘削を実施

◆ 風越山トンネル（黒田工区）



非常口トンネル掘削を実施

◆ 天竜川橋りょう



飯田市側橋脚躯体工事実施

◆ 駅部区間



土曽川橋りょうの橋脚基礎工事を実施
令和6年11月 竜西一貫水路付替え工事完了

2. リニア駅前広場整備

◆ 次世代インフラ、トータルデザイン、公民協働ブランドクリエイイト各PJによる検討

◆ 飯田・リニア駅前広場プラットフォーム設立



キックオフフォーラムの様子

3. リニア関連道路整備

◆ 国道153号飯田北改良



新戸川函渠工事を実施

◆ 座光寺上郷道路



JR飯田線アンダーパス工事
函渠工事、盛土工事を実施

◆ 県道市場桜町線



土曽川護岸工事(上郷側)
飯沼南地区軽量盛土工・擁壁等
拡幅工事を実施

【問い合わせ先】

飯田市リニア推進部 リニア推進課
TEL：0265-22-4511（内線3322）

リニア関連事業の状況は、右記QRコードから
映像でご覧いただけます。

市ウェブサイトからご覧いただく際は、

ID 115495 にて検索ください。

