令和6･7年度　過年発生土木施設補助災害復旧事業　橋梁災害復旧工事
（市道南信濃127号線　飯田市　南信濃　八日市場橋）

令和８年　第１回定例会
議案第30号　補足説明資料

側面図

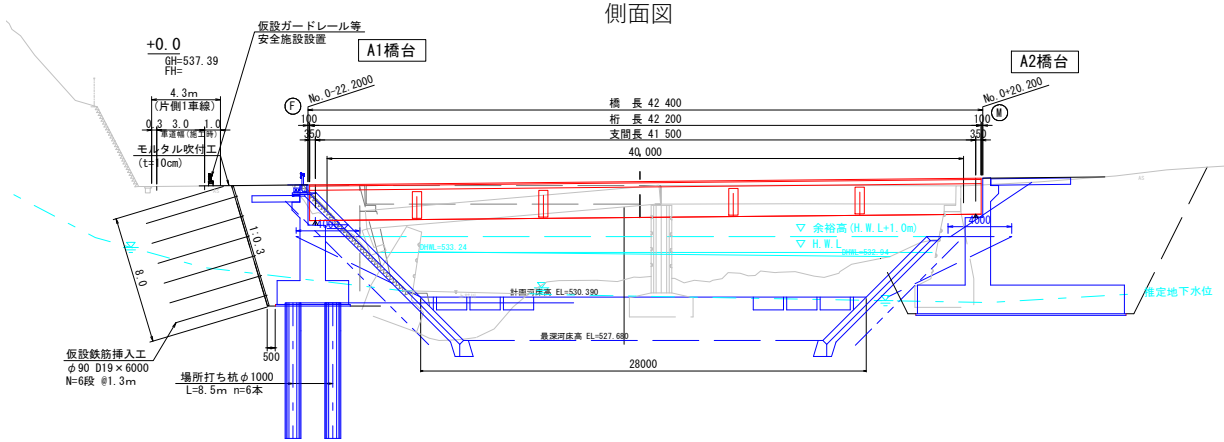

■ 工事概要
・復旧延長　L＝42.4m
　橋長　L＝42.4m　幅員W＝4.0m
　上部工（1径間単純鋼合成鈑桁橋）L＝42.4m

■ 当初請負額　166,925,000円

■ 変更請負額　180,125,000円（増額13,200,000円）

■ 当 初 工 期　令和7年3月21日～令和8年3月27日

■ 変 更 工 期　令和7年3月21日～令和8年6月26日

平面図

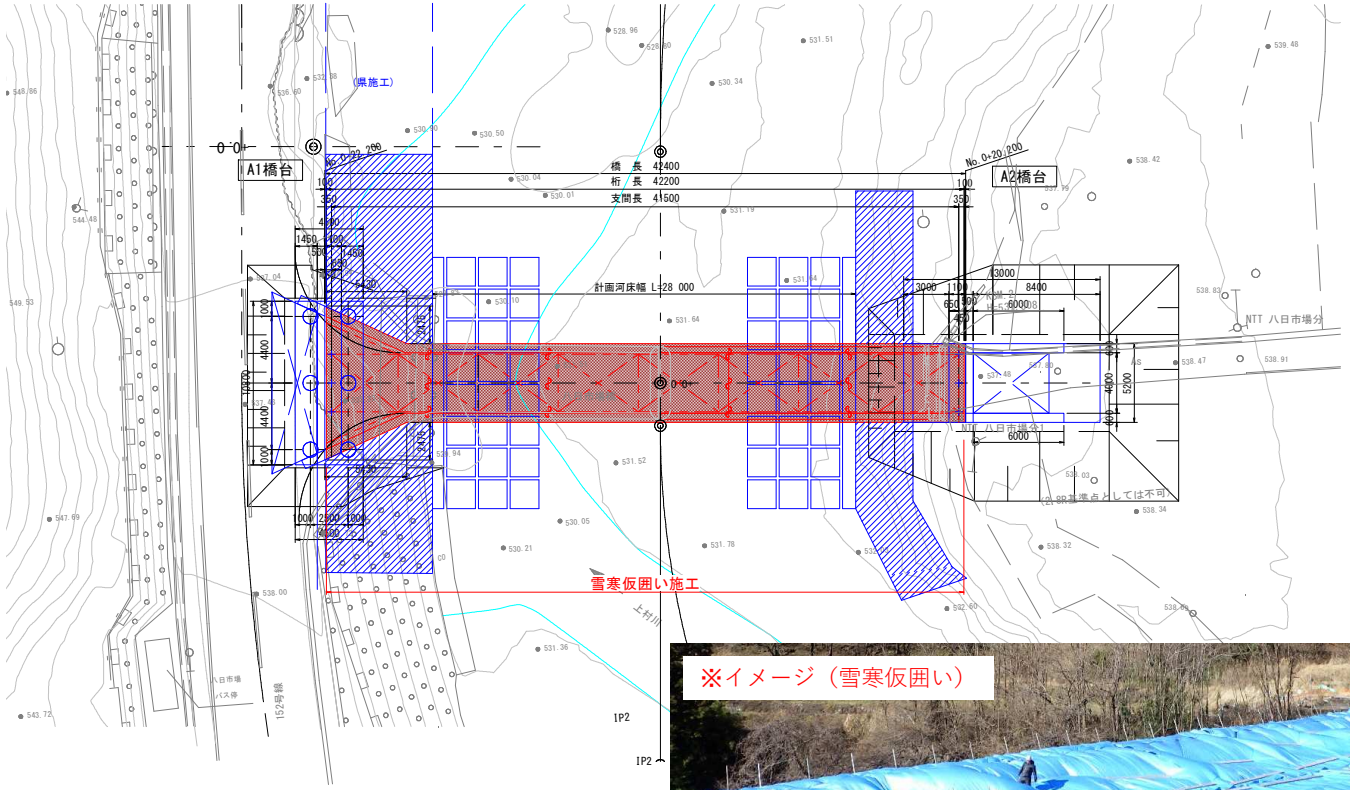

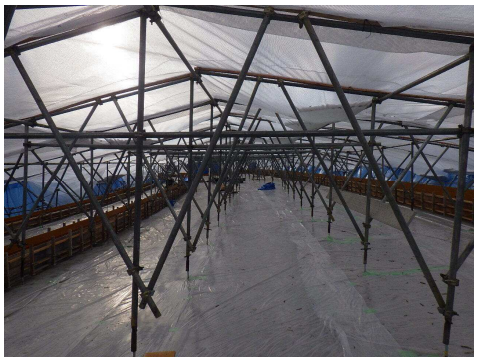

＜主な変更理由＞

①令和7年2月25日付け6建政技第325号の特例措置により、労務単価を令和7年3月1日適用の新労務単価に変更したことで増額となった。

○労務単価変更による増額（R7.1 → R7.3）

当初	変更後	増額
166,925,000	172,623,000	5,698,000

②想定以上の気温低下により、コンクリート打設時に初期凍害や品質低下が生じるおそれがあったため、品質確保を目的として雪寒仮囲いによる冬期養生を実施し、増額となった。
